



РОССЕТИ
ФСК ЕЭС

Центр инжиниринга
и управления строительством

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС»
(протокол от 30 апреля 2020 года № 220)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

по итогам 2019 года

Генеральный директор
АО «ЦИУС ЕЭС»

В.Ф. Вашкевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ	4
Сокращения	4
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	6
1.1. Общая информация об Обществе	6
1.2. Приоритетные направления деятельности АО «ЦИУС ЕЭС»	6
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	9
3.1. Организационная структура Общества. Представительства и филиалы Общества	9
3.2. Сведения об участии Общества в других организациях.	9
4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	11
5. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АО «ЦИУС ЕЭС»	14
6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	15
6.1. Общие сведения об организации корпоративного управления	15
6.2. Принципы и документы корпоративного управления	15
6.3. Сведения об органах управления и контроля	19
7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ЦИУС ЕЭС» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА	33
7.1. Основные финансово-экономические показатели АО «ЦИУС ЕЭС»	33
7.2. Производственная деятельность в части реализации функций технического заказчика	34
7.3. Производственная деятельность в части реализации инжиниринговых функций.....	52
8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	59
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	61
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	63

Приложение 1.1. Информация о крупных сделках, совершенных АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году

65

Приложение 1.2. Информация о сделках, совершенных АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....

82

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии.....

128

ГЛОССАРИЙ

Сокращения

В настоящем Годовом отчете приняты следующие сокращения:

Сокращение	Наименование сокращения
АО «ЦИУС ЕЭС», Общество	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»
АТ	Автотрансформатор
АЭС	Атомная электростанция
ВЛ	Воздушная линия
ВЭС	Ветряная электростанция
ГПП	Главная понизительная подстанция
ГРЭС	Историческое наименование (сохранилось как аббревиатура) – государственная районная электростанция
ГЭС	Гидроэлектростанция
ЕЭС	Единая энергетическая система
Задание компании	Поручение АО «ЦИУС ЕЭС» от ПАО «ФСК ЕЭС» с указанием необходимых параметров выполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках выполнения АО «ЦИУС ЕЭС» функций технического заказчика по договору от 01.03.2018 № Ц/02
ЗПО	Земельно-правовые отношения
ЗРУ	Закрытое распределительное устройство
КРУЭ	Комплектное распределительное устройство элегазовое
кВ	Единица измерения – киловольт
ЛЭП	Линия электропередачи
МВА	Единица измерения – мегавольт-ампер
МВАр	Единица измерения – мегавольт-ампер реактивный
МТриО	Материально-технические ресурсы и оборудование
МЭС	Магистральные электрические сети
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
ОПУ	Общеподстанционный пункт управления
ОРД	Организационно-распорядительный документ
ОРУ	Открытое распределительное устройство

Сокращение	Наименование сокращения
ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ПНР	Пусконаладочные работы
ППН	Постановка под напряжение
ПС	Подстанция
РУ	Распределительное устройство
СМР	Строительно-монтажные работы
СРО	Саморегулируемая организация
ТН	Трансформатор напряжения
ТП	Технологическое присоединение

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1.1. Общая информация об Обществе

АО «ЦИУС ЕЭС» учреждено распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2007 № 447р. 100% акций АО «ЦИУС ЕЭС» принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС». Государственная регистрация Общества осуществлена путем внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1087746041151. Начало производственной деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» - 01 апреля 2008 года.

1.2. Приоритетные направления деятельности АО «ЦИУС ЕЭС»

Приоритетным направлением деятельности Общества является реализация инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве технического заказчика. Основными задачами при выполнении АО «ЦИУС ЕЭС» функций технического заказчика являются соблюдение сроков реализации инвестиционной программы, высокое качество выполнения работ, обеспечение надежности введенных в эксплуатацию объектов и повышение экономической эффективности инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

В дополнение к основному виду деятельности в качестве технического заказчика АО «ЦИУС ЕЭС» выполняет инжиниринговые функции при реализации проектов электросетевого строительства, не относящихся к инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС». Основной целью выхода АО «ЦИУС ЕЭС» в качестве инжиниринговой компании на внешний рынок является диверсификация деятельности, которая позволит получить дополнительный доход и, как следствие, повысить рентабельность и финансовую устойчивость Общества.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основным заказчиком услуг, оказываемых АО «ЦИУС ЕЭС», является ПАО «ФСК ЕЭС», что гарантирует стабильность спроса на услуги Общества.

За двенадцать лет работы в качестве заказчика-застройщика и технического заказчика Обществом накоплен значительный опыт и сформирована высокопрофессиональная команда, что позволяет успешно решать самые сложные задачи в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». АО «ЦИУС ЕЭС» намерено наращивать компетенции технического заказчика, что приведет к повышению качества реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». Рост компетенций, повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг создают благоприятные предпосылки для сохранения АО «ЦИУС ЕЭС» статуса технического заказчика при реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

С учетом накопленных компетенций и опыта работы в качестве заказчика-застройщика и технического заказчика АО «ЦИУС ЕЭС» имеет существенный потенциал для расширения своей производственной деятельности и выполнения инжиниринговых функций при реализации проектов электросетевого строительства, не относящихся к инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС». Опыт работы АО «ЦИУС ЕЭС» в 2015—2019 гг. на рынке внешних заказов подтверждает наличие спроса на услуги Общества со стороны крупных производственных холдингов.

В связи с полученным по итогам работы за 9 месяцев 2019 года убытком, Обществом разработана программа финансового оздоровления на 2019—2023 годы, которая направлена на покрытие балансового убытка и восстановление стоимости чистых активов до размера уставного капитала. Программа финансового оздоровления утверждена решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» 16.12.2019 (протокол заседания Совета директоров от 17.12.2019 № 204) и включает достижение следующих финансово-экономических показателей на 2020 год:

	тыс. руб.	
Наименование показателя	2019 год (факт)	2020 год
Выручка от реализации	8 440 212	7 958 456
Чистая прибыль	-845 425	296 255

Для достижения указанных показателей в 2020 году Общество планирует осуществление следующих основных мероприятий:

- мероприятия, направленные на получение дополнительной прибыли:
- оптимизация расходов;

– работа с проблемной дебиторской задолженностью с целью возврата денежных средств и уменьшения резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении данной задолженности;

– получение дополнительных доходов по реализуемым инжиниринговым проектам и новым проектам, начало реализации которых планируется в 2020 году.

▪ мероприятия, направленные на обеспечение притока денежных средств и увеличение стоимости чистых активов путем увеличения собственного капитала АО «ЦИУС ЕЭС».

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Организационная структура Общества. Представительства и филиалы Общества

АО «ЦИУС ЕЭС» состоит из исполнительного аппарата и обособленных подразделений (филиалов). Организационная структура Общества утверждена решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2019 № 206). В состав АО «ЦИУС ЕЭС» входят следующие филиалы:

№ п/п	Наименование филиала	Местонахождение филиала
1.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра	121353, г. Москва, ул. Беловежская д. 4, к. Б
2.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада	194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 9А
3.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга	357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, д. 13, корпус 4
4.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 5
5.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири	628408, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4, офис 2
6.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири	660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 66А
7.	Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65


3.2. Сведения об участии Общества в других организациях

АО «ЦИУС» не участвует в уставном капитале других хозяйственных обществ, не имеет дочерних и зависимых обществ.

АО «ЦИУС» участвует в следующих саморегулируемых организациях:

▪ Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»;

▪ Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».

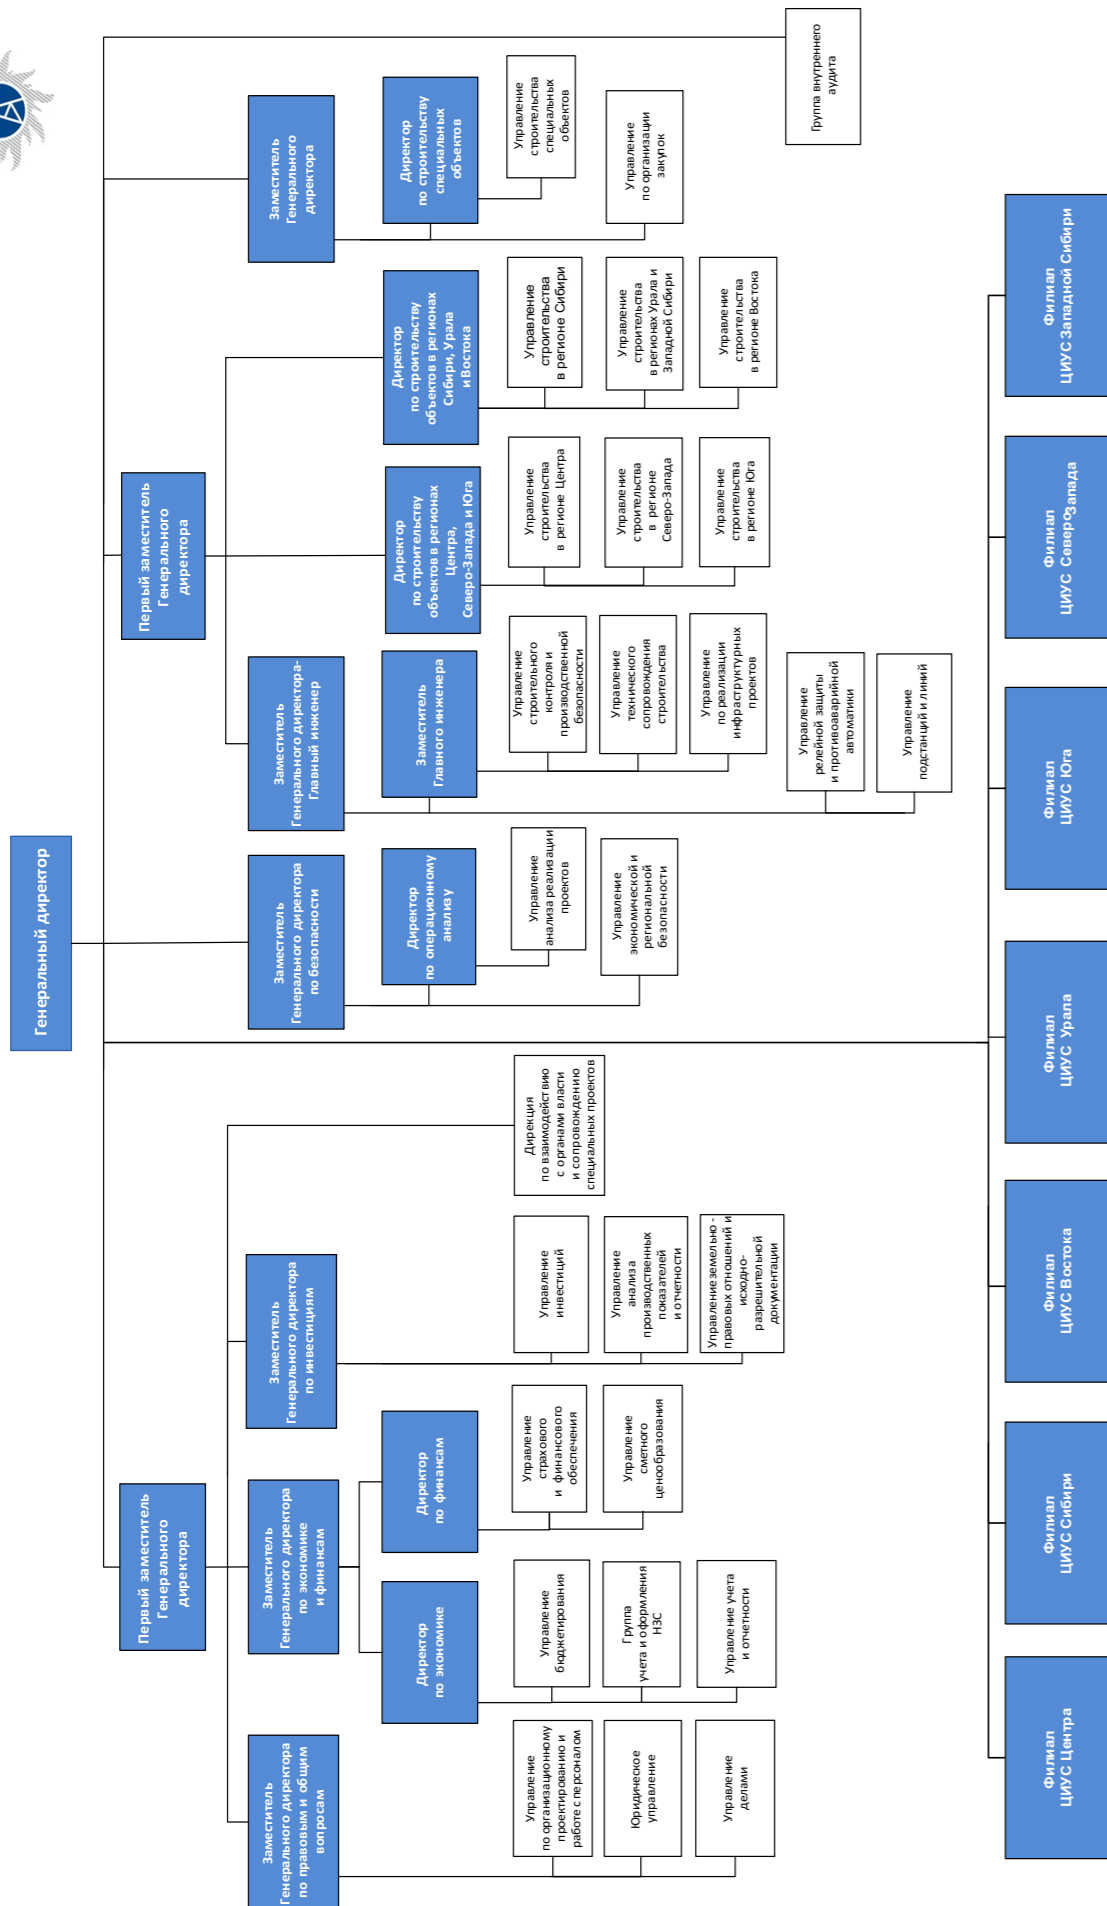

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система управления рисками является элементом общей системы управления АО «ЦИУС ЭЭС», целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Система управления рисками объединяет в себе механизмы и инструменты для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления рисками.

Основными документами, регламентирующими систему управления рисками в Обществе, являются:

- Положение о системе управления рисками АО «ЦИУС ЭЭС», утвержденное решением Совета директоров от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 131);
- приказ АО «ЦИУС ЭЭС» от 27.02.2017 № 28 «О Регламенте взаимодействия АО «ЦИУС ЭЭС» с Дирекцией внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЭЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля»;
- приказ АО «ЦИУС ЭЭС» от 02.10.2017 № 196 «Об утверждении Порядка реализации требований Положения о системе внутреннего контроля АО «ЦИУС ЭЭС»;
- приказ АО «ЦИУС ЭЭС» от 08.08.2017 № 153 «Об утверждении методологических документов в области управления рисками».

В целях совершенствования системы управления рисками в Обществе приказом АО «ЦИУС ЭЭС» от 29.03.2019 № 91 утвержден реестр операционных рисков АО «ЦИУС ЭЭС», включающий в себя 51 операционный риск по всем направлениям деятельности Общества, которые ежеквартально актуализируются и формализуются в паспортах риска.

Кроме операционных рисков АО «ЦИУС ЭЭС» выделяет стратегические риски, с которыми может столкнуться в процессе осуществления производственной деятельности, и стремится к созданию максимально эффективной системы внутреннего контроля по предупреждению появления таких рисков, а в случае выявления - устранению на всех этапах реализации проектов.

➤ Риск, обусловленный сокращением инвестиционной программы ПАО «ФСК ЭЭС»

Реализация риска может привести к сокращению объемов финансирования АО «ЦИУС ЭЭС» в рамках договора на выполнение функций технического заказчика между ПАО «ФСК ЭЭС» и Обществом.

Мероприятия, проводимые для предупреждения данного риска:

- расширение круга потенциальных заказчиков (заключение, по согласованию с ПАО «ФСК ЕЭС», договоров со сторонними заказчиками на выполнение инжиниринговых функций);

- повышение операционной эффективности и снижение издержек Общества;

- поиск и внедрение новых инновационных технологий строительства и реконструкции.

➤ **Риск, обусловленный недостаточным количеством надежных подрядчиков и поставщиков**

Недостаток квалифицированных, финансово устойчивых подрядчиков и поставщиков может привести к срыву сроков исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

Мероприятия, проводимые для минимизации данного риска:

- привлечение по результатам конкурсных процедур наиболее квалифицированных и финансово устойчивых подрядных организаций с большим опытом работы в отрасли;

- постоянное взаимодействие с поставщиками и подрядчиками по вопросам планирования;

- постоянный мониторинг финансовой устойчивости подрядных организаций;

- проведение комплекса мероприятий по аттестации оборудования новых поставщиков.

➤ **Риск, обусловленный некачественным выполнением проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ**

Некачественное выполнение работ на любом этапе реализации инвестиционного проекта может привести к срыву сроков или существенному удорожанию реализации инвестиционного проекта.

Мероприятия, проводимые для минимизации данного риска:

- привлечение по результатам конкурсных процедур наиболее квалифицированных и финансово устойчивых подрядных организаций с большим опытом работы в отрасли;

- обеспечение согласования с заказчиком выбора генподрядчиком субподрядных организаций;

- проверка готовности подрядных организаций к проведению работ на объектах;

- ведение строительного контроля строго в соответствии с нормативными документами;

- регулярное обучение и повышение квалификации персонала;

- поддержание системы менеджмента качества АО «ЦИУС ЕЭС» в актуальном состоянии.

➤ **Риск, обусловленный санкциями со стороны заказчиков вследствие несоблюдения условий договоров строительного подряда, по которым АО «ЦИУС ЕЭС» выступает генеральным подрядчиком**

Данный риск минимизируется путем перевыставления штрафных санкций субподрядным организациям, действия которых привели к нарушению условий договоров строительного подряда.

➤ **Риск, обусловленный убыточностью договоров, по которым АО «ЦИУС ЕЭС» выступает генеральным подрядчиком**

Данный риск может быть реализован в случае непредвиденных изменений, оказывающих влияние на экономику проектов.

Данный риск минимизируется за счет реализации следующих мероприятий:

- включение в договоры с заказчиками условия о компенсации заказчиком непредвиденных расходов;

- компенсация непредвиденных расходов, которые заказчик отказывается финансировать, субподрядными организациями.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АО «ЦИУС ЕЭС»

Уставный капитал АО «ЦИУС ЕЭС» составляет 833 000 000 рублей, разделенных на 833 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью один рубль каждая.

Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-12862-А зарегистрирован региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе, дата государственной регистрации 07.03.2008.

100% акций АО «ЦИУС ЕЭС» принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с Уставом АО «ЦИУС ЕЭС» вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям разместить 833 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 833 000 000 рублей.

Решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания от 06.02.2008 № 2) регистратором АО «ЦИУС ЕЭС» утверждено АО «СТАТУС».

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Общие сведения об организации корпоративного управления

Структура и компетенция органов управления Акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЦИУС ЕЭС». Существующая система корпоративного управления в АО «ЦИУС ЕЭС» основана на единых корпоративных стандартах, ориентирована на повышение эффективности операционной деятельности Общества.

В Обществе выстроена трехуровневая система управления, высшим органом управления в которой является Общее собрание акционеров, коллегиальным органом управления является Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС». Оперативное управление АО «ЦИУС ЕЭС» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ЦИУС ЕЭС», избранным Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЦИУС ЕЭС» Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

6.2. Принципы и документы корпоративного управления

В 2014 году Банком России утвержден и рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам (публичные акционерные общества), Кодекс корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Единственным акционером АО «ЦИУС ЕЭС» является ПАО «ФСК ЕЭС». Общество не относится к категории публичных акционерных обществ и вправе не применять Кодекс корпоративного управления, но в своей деятельности Общество стремится к соблюдению принципов и требований, рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Уставом и внутренними документами Общества предусмотрены механизмы, обеспечивающие возможность акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органам управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

В своей деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» следует основным принципам корпоративного управления, принимая и осознавая свою ответственность перед широким кругом заинтересованных лиц, а именно:

- АО «ЦИУС ЕЭС» действует с целью получения прибыли;
- АО «ЦИУС ЕЭС» четко определяет и раскрывает свою стратегию и задачи;

- информация о перспективах АО «ЦИУС ЕЭС», поставленных целях, сроках и способах их достижения, а также о возможных рисках и влияниях внешней среды доводится до сведения акционера и других заинтересованных лиц;

- в своей деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» ориентируется на долгосрочную перспективу, при этом стремясь к соблюдению баланса интересов акционера, инвесторов, участников органов управления Общества, а также иных стейкхолдеров;

- учитывая высокую значимость реализуемых Обществом проектов, одним из приоритетов для АО «ЦИУС ЕЭС» является повышение прозрачности его деятельности, в том числе путем раскрытия существенной информации о своей деятельности с целью обеспечения широкому кругу лиц доступа к точной, объективной, своевременной, доступной и достаточной информации;

- при осуществлении своей деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» обеспечивает надлежащий уровень охраны окружающей среды, безопасности труда и социальной защищенности своих работников.

Корпоративное управление в АО «ЦИУС ЕЭС» основано на нормативных правовых актах Российской Федерации и локальных нормативно-правовых актах АО «ЦИУС ЕЭС», что обеспечивает максимальную защиту прав акционера, а также необходимые условия для реализации его интересов.

Устав АО «ЦИУС ЕЭС» утвержден решением ПАО «ФСК ЕЭС» - единственного акционера АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.07.2018 № 1565). Изменения и дополнения в Устав АО «ЦИУС ЕЭС» утверждены решением ПАО «ФСК ЕЭС» - единственного акционера АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2018 № 1596).

В Обществе по состоянию на 31.12.2019 действуют следующие утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы:

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597);

- Положение о Ревизионной комиссии АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597);

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 года № 1641);

- Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 года № 1641).

В Обществе действуют следующие утвержденные Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС» внутренние документы:

- Положение о порядке управления долговой позицией ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.12.2008 № 9);

- Порядок ведения Реестра нефинансового капитала ОАО «ЦИУС ЕЭС» и представления информации из него (протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 24.12.2010 № 36);

- Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 15.11.2012 № 60 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 31.05.2013 № 67);

- Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 23.09.2016 № 118);

- Стандарт бизнес-планирования АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 05.12.2016 № 122 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 18.10.2018 № 170, от 02.11.2018 № 171);

- Положение об обеспечении страховой защиты АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 23.12.2016 № 123);

- Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 26.01.2017 № 126);

- Программа повышения качества работ (услуг) АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 21.02.2017 № 128);

- Положение о системе управления рисками АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 05.04.2017 № 131);

- Антикоррупционная политика АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 03.08.2017 № 139);

- Регламент реализации коммуникационной политики АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 03.08.2017 № 139);

- Экологическая политика АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 11.08.2017 № 140);

- Положение о системе внутреннего контроля АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 29.08.2017 № 141);

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 27.09.2017 № 143);

- Стратегия развития АО «ЦИУС ЕЭС» на 2017-2021 гг. с прогнозом до 2031 года (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 26.12.2017 № 149);

- Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 27.09.2018 № 166);

- Порядок организации продажи непрофильных активов АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 27.09.2018 № 166);

- Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.01.2019 № 179 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 28.10.2019 № 200);

- Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.01.2019 № 179 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 28.10.2019 № 200);

- Положение о дивидендной политике АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 13.02.2019 № 181);

- Положение о Секретаре Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 13.02.2019 № 181);

- Регламент осуществления платежей по административно-хозяйственному обеспечению деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 03.07.2019 № 191);

- Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 26.08.2019 № 195);

- Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 26.08.2019 № 195 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 31.12.2019 № 207);

- Положение о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью Высших менеджеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 28.10.2019 № 200);

- Положение о внутреннем аудите АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.11.2019 № 201);

- Положение о формировании социального пакета работников АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.11.2019 № 201);

- Единый стандарт закупок АО «ЦИУС ЕЭС» (Положение о закупке) товаров, работ, услуг для нужд АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 22.11.2019 № 202).

АО «ЦИУС ЕЭС» в полном объеме выполняет требования законодательства Российской Федерации в области раскрытия информации.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, а также в целях контроля за своевременным раскрытием информации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в АО «ЦИУС ЕЭС» было разработано и утверждено Положение о порядке взаимодействия структурных

подразделений исполнительного аппарата АО «ЦИУС ЕЭС» при осуществлении раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг (приказ АО «ЦИУС ЕЭС» от 07.09.2012 № 233).

Список аффилированных лиц АО «ЦИУС ЕЭС» размещен на корпоративном сайте Общества по адресу:

http://www.cius-ees.ru/shareholder/list_aff/.

6.3. Сведения об органах управления и контроля

6.3.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «ЦИУС ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом АО «ЦИУС ЕЭС».

В соответствии с Уставом АО «ЦИУС ЕЭС», в период владения ПАО «ФСК ЕЭС» всеми голосующими акциями АО «ЦИУС ЕЭС», функции Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» выполняет Правление ПАО «ФСК ЕЭС». Решения Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» оформляются письменно и доводятся до сведения АО «ЦИУС ЕЭС» в порядке, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС», регулирующими деятельность Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

На годовом Общем собрании акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляющего полномочия годового Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС», от 20.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1641) был утвержден годовой отчет АО «ЦИУС ЕЭС» по итогам 2018 года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦИУС ЕЭС», по результатам 2018 года, распределена прибыль (убытки) АО «ЦИУС ЕЭС» по результатам 2018 финансового года, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦИУС ЕЭС» по результатам 2018 года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор АО «ЦИУС ЕЭС».

В 2019 году также состоялось 19 внеочередных Общих собраний акционеров АО «ЦИУС ЕЭС», на которых были рассмотрены и приняты решения по 19 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

6.3.2. Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС»

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Генерального директора Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом

Общества. Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет общее руководство деятельностью АО «ЦИУС ЕЭС» за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЦИУС ЕЭС» к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», а также иными внутренними документами Общества.

Компетенция Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» определена Уставом АО «ЦИУС ЕЭС», размещенном на корпоративном сайте:

[http://www.cius-ees.ru/shareholder/documents/.](http://www.cius-ees.ru/shareholder/documents/)

В 2019 году управление АО «ЦИУС ЕЭС» осуществлялось под руководством четырех составов Совета директоров Общества.

Действующий по состоянию на 31.12.2019 состав Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» от 20.09.2019 (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 1659) в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Мольский Алексей Валерьевич	Дата рождения: 17.08.1980
Врио Первого заместителя Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство: Российская Федерация
	Образование: 2004 г., Московский энергетический институт, Электроэнергетические системы и сети, инженер; 2004 г., Московский энергетический институт, Экономика и управление на предприятии электроэнергетики, инженер-

	экономист
	Опыт работы: 2010—2012 гг. – начальник Департамента реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС»; 2012—2012 гг. – Заместитель Главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»; 2012—2019 гг. – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; с 2019 г. – Врио Первого заместителя Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Вашкевич Владимир Франтишкович	Дата рождения: 22.06.1972
Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»	Гражданство: Российская Федерация
	Образование: 1992 г., Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова, социальный педагог-психолог; 1998 г., Санкт-Петербургский финансово-экономический колледж, Финансы, финансист; 2004 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Юриспруденция, юрист; 2013 г., Кубанский государственный технологический университет, Электроснабжение, инженер
	Опыт работы: 2013—2014 гг. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»; 2014—2015 гг. – заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада; 2015—2018 гг. – Генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги; с 2018 г. – Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»
Коновал Андрей Викторович	Дата рождения: 06.12.1960
Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство: Российская Федерация
	Образование: 1983 г., Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, Политическая экономия, экономист, преподаватель политической экономии
	Опыт работы: 2015—2016 гг. - Советник Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС»; с 2016 г. - Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения

		эффективности деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»	операционной
Корсунов Павел Юрьевич	Дата рождения:	23.03.1971	
Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация	
	Образование:	1994 г ., Московский государственный инженерно-физический институт	
	Опыт работы	2010—2014 гг . - Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»; с 2014 г . - Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	
Юрченко Юлия Юрьевна	Дата рождения:	15.06.1978	
Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация	
	Образование:	2000 г ., Тюменский государственный университет, Менеджмент	
	Опыт работы	2015—2019 гг ., Заместитель Генерального директора по экономике и финансам филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада; с 2019 г . - Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»	
Палагин Виктор Николаевич	Дата рождения:	02.12.1956	
Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация	
	Образование:		
	Опыт работы	с 2018 г . – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	
Этингоф Константин Золевич	Дата рождения:	28.01.1969	
Начальник правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация	
	Образование:	1990 г ., Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова; 1997 г ., Санкт-Петербургский государственный университет, История; 2003 г ., Северо-Западная академия государственной службы, Юриспруденция	
	Опыт работы	2012 г . - консультант Председателя Законодательного Собрания Ленинградской области; 2012—2014 гг . – Министр юстиции член Правительства Республики Карелия; с 2014 г . - начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	

Решением Совета директоров от 01.10.2019 (протокол от 02.10.2019 № 197) Председателем Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Мольский

Алексей Валерьевич, заместителем Председателя Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Корсунов Павел Юрьевич.

Состав Совета директоров, действовавший с 20.06.2019 до 20.09.2019, избран решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» от 20.06.2019 (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1641) в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Мольский Алексей Валерьевич	Дата рождения:	17.08.1980
Врио Первого заместителя Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее
Вашкевич Владимир Франтишкович	Дата рождения:	22.06.1972
Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»	Образование:	высшее
Коновал Андрей Викторович	Дата рождения:	06.12.1960
Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее
Корсунов Павел Юрьевич	Дата рождения:	23.03.1971
Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее
Паришкара Дмитрий Николаевич	Дата рождения:	26.09.1973
Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее
Палагин Виктор Николаевич	Дата рождения:	02.12.1956
Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее
Этингоф Константин Золевич	Дата рождения:	28.01.1969
Начальник правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее

Решением совета директоров от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 № 190) Председателем Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Мольский Алексей Валерьевич, заместителем Председателя Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Корсунов Павел Юрьевич.

Состав Совета директоров, действовавший с 09.04.2019 до 20.06.2019, избран решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» от 09.04.2019 (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.04.2019 (протокол от 10.04.2019 № 1626) в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Мольский Алексей Валерьевич	Дата рождения:	17.08.1980
Врио Первого заместителя Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Образование:	высшее

Вашкевич Владимир Франтишкович Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»	Дата рождения: 22.06.1972 Образование: высшее
Коновал Андрей Викторович Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 06.12.1960 Образование: высшее
Корсунов Павел Юрьевич Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 23.03.1971 Образование: высшее
Паришка Дмитрий Николаевич Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 26.09.1973 Образование: высшее
Палагин Виктор Николаевич Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 02.12.1956 Образование: высшее
Этингоф Константин Золевич Начальник правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 28.01.1969 Образование: высшее

Решением совета директоров от 17.04.2019 (протокол от 19.04.2019 № 185) Председателем Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Мольский Алексей Валерьевич, заместителем Председателя Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Корсунов Павел Юрьевич.

Состав Совета директоров, действовавший с 15.10.2018 до 09.04.2019, избран решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» от 15.10.2018 (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.10.2018 (протокол от 16.10.2018 № 1585) в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Филимонов Роман Евгеньевич Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 31.07.1968 Образование: высшее
Вашкевич Владимир Франтишкович Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»	Дата рождения: 22.06.1972 Образование: высшее
Коновал Андрей Викторович Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 06.12.1960 Образование: высшее
Корсунов Павел Юрьевич Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 23.03.1971 Образование: высшее

Паришка Дмитрий Николаевич Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 26.09.1973 Образование: высшее
Чарыков Владимир Иванович Директор по безопасности – начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 18.05.1959 Образование: высшее
Этингоф Константин Золевич Начальник правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»	Дата рождения: 28.01.1969 Образование: высшее

Решением совета директоров от 17.10.2018 (протокол от 18.10.2018 № 170) Председателем Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Филимонов Роман Евгеньевич, заместителем Председателя Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран Корсунов Павел Юрьевич.

Члены Совета директоров сделок с акциями Общества в течение отчетного периода не совершали. Никто из членов Совета директоров акциями АО «ЦИУС ЕЭС» не владеет.

В период с 01.01.2019 по 19.06.2019 выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 (протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» № 972).

В период с 20.06.2019 выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением ПАО «ФСК ЕЭС» - единственного акционера АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641) согласно которому:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества;

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем)

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, путем заполнения членом Совета директоров и направления опросного листа в случаях невозможности явки члена Совета директоров на заседание, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением, на день проведения заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

В 2019 году членам Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» выплачено вознаграждение в сумме 6 138 356 рублей.

Обучение членов Совета директоров за счет средств АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году не проводилось.

Компенсация расходов членам Совета директоров за счет средств АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году не осуществлялась.

Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС» комитеты Совета директоров в 2019 году не создавались.

Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС» провел в 2019 году 29 заседаний (из них: 27 в форме зочного голосования и 2 в форме совместного присутствия членов Совета директоров), на которых было рассмотрено 139 вопросов различного направления и характера, в том числе вопросы утверждения локальных нормативных актов.

Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году были утверждены:

- Положение о дивидендной политике АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 13.02.2019 № 181);
- Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 26.08.2019 № 195);
- Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 26.08.2019 № 195 с изменениями утвержденными Советом директоров от 31.12.2019 № 207);
- Единый стандарт закупок (Положение о закупке) товаров, работ, услуг для нужд АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 22.11.2019 № 202);

- Положение о Секретаре Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 13.02.2019 № 181);

- Регламент осуществления платежей по административно-хозяйственному обеспечению деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 03.07.2019 № 191);

- Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.01.2019 № 179 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 28.10.2019 № 200);

- Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.01.2019 № 179 с изменениями, утвержденными Советом директоров от 28.10.2019 № 200);

- Положение о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью Высших менеджеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 28.10.2019 № 200);

- Положение о внутреннем аудите АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.11.2019 № 201).

В рамках осуществления контрольных функций Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС» рассматривались отчеты об исполнении бизнес-плана АО «ЦИУС ЕЭС», отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЦИУС ЕЭС», отчеты Генерального директора об исполнении Государственного контракта от 01.10.2015 № 80.КС, а также отчеты Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЦИУС ЕЭС».

6.3.3. Сведения о Генеральном директоре

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

С 11.09.2018 полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» осуществляет Вашкевич Владимир Франтишкович (протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 07.09.2018 № 164).

Вашкевич Владимир Франтишкович	
Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»	
Дата рождения:	22.06.1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование:	1992 г., Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова, социальный педагог-психолог; 1998 г., Санкт-Петербургский финансово-экономический колледж, Финансы, финансист; 2004 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Юриспруденция, юрист; 2013 г., Кубанский государственный технологический университет, Электроснабжение, инженер
Работа в прошлом:	2013—2014 гг. - Генеральный директор, ОАО «МРСК Юга» 2014—2015 гг. - заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада 2015—2018 гг. - Генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги с 2018 г. - Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»

Оплата труда Вашкевича В.Ф. производилась в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС», являющимися приложениями к трудовому договору с Генеральным директором АО «ЦИУС ЕЭС» Вашкевичем Владимиром Франтишковичем от 11.09.2018 № 40/18.

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад и премии, установленные Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС», согласно которому основанием для премирования и определения размера премии за выполнение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) является утвержденный Советом директоров Общества отчет о достигнутых фактических значениях КПЭ за отчетный период.

Размеры премий Генерального директора утверждаются Советом директоров Общества после утверждения отчета о выполнении КПЭ АО «ЦИУС ЕЭС» за соответствующий календарный квартал, календарный год.

Сумма вознаграждения в части фонда оплаты труда Вашкевича В.Ф. за 2019 год составила 12 927 152,76 рублей.

6.3.4. Ревизионная комиссия АО «ЦИУС ЕЭС»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЦИУС ЕЭС» Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества действует в рамках компетенции, определенной Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», утвержденным решением ПАО «ФСК ЕЭС» - единственного акционера Общества (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597).

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества опубликован на корпоративном сайте Общества:

<http://www.cius-ees.ru/shareholder/documents/>.

До 20.06.2019 действовал следующий состав Ревизионной комиссии (должности указаны на момент избрания), избранный решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 (протокол от 28.06.2018 № 1559):

Ковалева Николаевна	Светлана	Дата рождения:	08.05.1980
		Гражданство:	Российская Федерация
Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»		Образование:	2002 г., Академия гражданской авиации, Юриспруденция
		Опыт работы	2013–2017 гг. – Первый заместитель начальника Правового Департамента ПАО «ФСК ЕЭС»; с 2017 г. – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Тришина Михайловна	Светлана	Дата рождения:	17.11.1979
		Гражданство:	Российская Федерация
Начальник Отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»		Образование:	2001 г., Амурский государственный университет, Финансы и кредит, экономист по финансовой работе, банковский работник; 2018 г., Международная академия экспертизы и оценки, Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях, специалист по внутреннему аудиту и контролю в коммерческих организациях
		Опыт работы	2007–2017 гг., – ведущий эксперт, начальник Управления ведения учета Департамента корпоративного учета и отчетности ПАО «РусГидро» (ОАО «ГидроОГК»);

		с 2017 г. – начальник Отдела финансового аудита, начальник Отдела финансового аудита, методологии и отчетности, начальник Отдела корпоративного аудита и контроля ДО, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Рогачев Кирилл Евгеньевич	Дата рождения:	17.12.1984
Главный эксперт Отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация
	Образование:	2006 г., МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер; 2011 г., Московский пограничный институт ФСБ России, Юриспруденция, юрист; 2018 г., Международная академия экспертизы и оценки, Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях, специалист по внутреннему аудиту и контролю в коммерческих организациях
	Опыт работы	2006–2010 гг. – государственный налоговый инспектор инспекции ФНС России № 31 по г. Москве; с 2010 г. – главный эксперт Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Царьков Виктор Владимирович	Дата рождения:	19.09.1977
Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация
	Образование:	2005 г., Московский институт экономики, менеджмента и права, Финансы и кредит, экономист; 2007 г., Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации, Государственное и муниципальное управление, антикризисное управление, менеджер
	Опыт работы	2014 – 2015 гг. – Советник АО «СО ЕЭС»; с 2017 г. – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Феоктистов Игорь Владимирович	Дата рождения:	03.07.1964
Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»	Гражданство:	Российская Федерация
	Образование:	2014 г., НОУ ВПО Академия МНЭПУ, Юриспруденция
	Опыт работы	2015–2017 гг. – Директор по безопасности – начальник Управления безопасности ОАО «МОЭСК»; 2017–2020 гг. – Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» (решение Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1641) Ревизионная комиссия АО «ЦИУС ЕЭС» избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Ковалёва Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2.	Тришина Светлана Михайловна	Начальник Отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»

В период с 01.01.2019 по 19.06.2019 выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 (протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» № 972).

В период с 20.06.2019 выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением ПАО «ФСК ЕЭС» - единственного акционера АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641), согласно которому за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 5 (пятикратной) суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на дату составления заключения (акта) по результатам проведенной проверки (ревизии).

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

По итогам ревизионной проверки за 2018 год членам Ревизионной комиссии выплачено в 2019 году вознаграждение в размере 662 475 рублей. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам проверки

за 2019 год будет осуществлена в 2020 году после получения заключения Ревизионной комиссии за 2019 год.

Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии за счет средств АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году не осуществлялась.

6.3.5. Внутренний аудит

Во исполнение решения Правления ПАО «ФСК ЕЭС» в области внутреннего аудита (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.03.2019 № 1620/2) решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 14.11.2019 (протокол от 14.11.2019 № 201) утверждено Положение о внутреннем аудите АО «ЦИУС ЕЭС».

Генеральным директором АО «ЦИУС ЕЭС» 21.11.2019 утверждены Положение о Группе внутреннего аудита АО «ЦИУС ЕЭС» и должностная инструкция эксперта Группы внутреннего аудита АО «ЦИУС ЕЭС».

Решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 24.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 206) утверждена организационная структура АО «ЦИУС ЕЭС», куда вошло вновь созданное структурное подразделение - Группа внутреннего аудита.

Приказом АО «ЦИУС ЕЭС» № 157/ОМ от 26.12.2019 внесены изменения в штатное расписание исполнительного аппарата АО «ЦИУС ЕЭС» в части включения Группы внутреннего аудита в составе 3 штатных единиц.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ЦИУС ЕЭС» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

7.1. Основные финансово-экономические показатели АО «ЦИУС ЕЭС»

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2019 год
1.	Выручка	тыс. руб.	8 440 212
2.	Себестоимость	тыс. руб.	7 524 344
3.	Валовая прибыль	тыс. руб.	915 868
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-845 425
5.	ЕВITDA	тыс. руб.	539 326
6.	Среднесписочная численность	чел.	810

По итогам работы за 2019 год выручка составила 8 440 212 тыс. руб. Выручка от основной деятельности, связанной с оказанием услуг технического заказчика, составила 1 707 750 тыс. руб., что на 11% выше показателя за 2018 год. Выручка от реализации инжиниринговой деятельности составила в 2019 году 6 732 462 тыс. руб., что на 51% ниже аналогичного показателя за 2018 год. Снижение выручки по инжиниринговой деятельности по сравнению с 2018 годом объясняется тем, что наиболее активная фаза реализации крупных инжиниринговых проектов пришлось на 2018 год. В 2020 году АО «ЦИУС ЕЭС» планирует заключение новых инжиниринговых контрактов, в том числе со сторонними заказчиками.

По итогам работы за 2019 год достигнут положительный финансовый результат от операционной деятельности: валовая прибыль АО «ЦИУС ЕЭС» составила 915 868 тыс. руб., прибыль от продаж – 147 192 тыс. руб., ЕВITDA – 539 326 тыс. руб.

В 2019 году процентные расходы по займу составили 58 132 тыс. руб., что на 78 205 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году. По состоянию на 31.12.2019 задолженность по займу погашена в полном объеме.

В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год АО «ЦИУС ЕЭС» получен убыток в размере 845 425 тыс. руб. Основной причиной убытка являются расходы на создание резерва по сомнительным долгам в размере 394 025 тыс. руб. и взыскание с АО «ЦИУС ЕЭС» денежных средств по решениям судов в размере 548 029 тыс. руб.

7.2. Производственная деятельность в части реализации функций технического заказчика

Основным видом деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» является выполнение функций технического заказчика в области капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения электросетевых объектов и объектов инфраструктуры по следующим основным направлениям:

- технологическое присоединение;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение;
- инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики;
- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- прочие инвестиционные проекты.

Плановые показатели производственной деятельности на 2019 год утверждены заданием компании АО «ЦИУС ЕЭС» в рамках договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций технического заказчика:

- Задание компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 22.01.2019 № ЗК2010-01;
- Задание компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 29.03.2019 № ЗК2019-02;
- Задание компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 28.06.2019 № ЗК2019-03;
- Задание компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 30.09.2019 № ЗК2019-04;
- Задание компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 31.12.2019 № ЗК2019-05.

Годовой отчет сформирован на основе задания компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 31.12.2019 № ЗК2019-05, утвержденного на основании инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020—2024 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 № 36@.

7.2.1. Показатели производственной деятельности в части реализации функций технического заказчика в 2019 году


7.2.1.1. Ввод объектов незавершенного строительства в состав основных средств в 2019 году

План ввода объектов незавершенного строительства в состав основных средств на 2019 год был определен в сумме 49 982,09 млн. руб. без НДС. Фактически в 2019 году введено основных средств на сумму 57 278,79 млн. руб. без НДС, что составляет 114,6% от плана, установленного ПАО «ФСК ЕЭС» для АО «ЦИУС ЕЭС» в рамках задания компании АО «ЦИУС ЕЭС» от 31.12.2019 № ЗК2019-05. В соответствии с целевыми показателями, установленными по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 01.03.2018 № Ц/02 данный показатель является выполненным.

Ввод объектов по разделам инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»:

№ п/п	Наименование раздела инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год	Ввод объектов незавершенного строительства в состав основных средств в 2019 году, млн. руб., без НДС
Всего по инвестиционной программе:		57 278,79
1.	Технологическое присоединение	49 847,69
2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	6 688,43
3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	223,19
4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	0,00
5.	Прочие инвестиционные проекты	519,48

Ниже приведена информация по объектам, введенным в 2019 году из незавершенного строительства в состав основных средств в региональном разрезе.

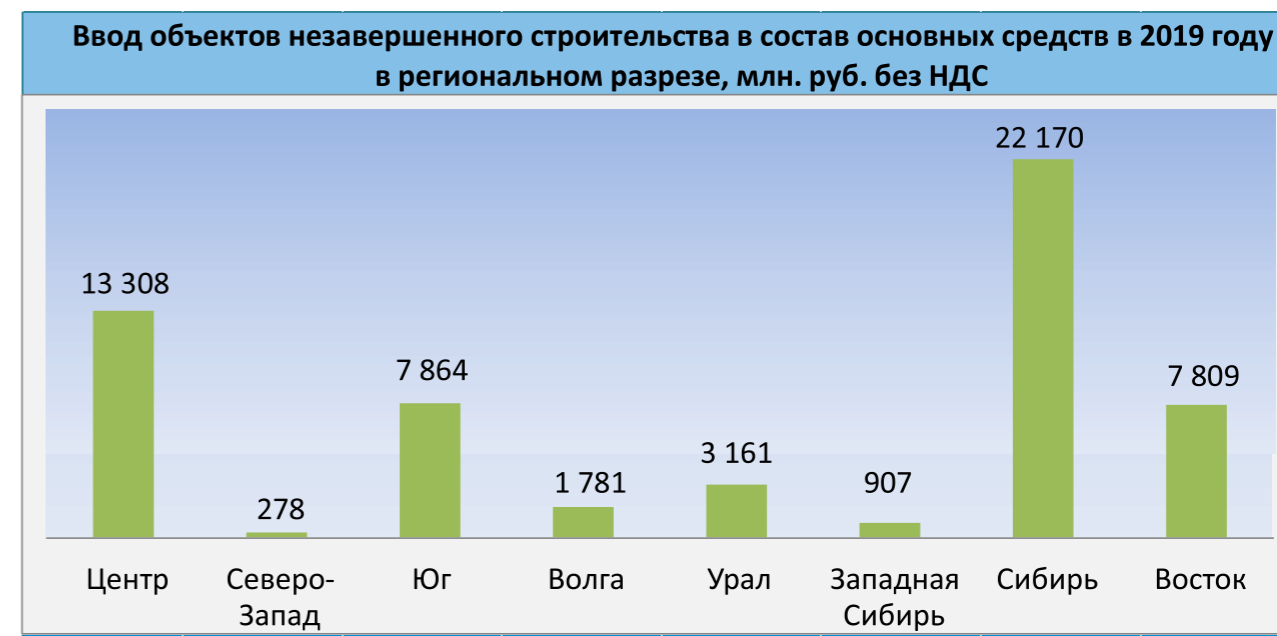

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году планировалось ввести в эксплуатацию:

- трансформаторная мощность – 2 490 МВА;
- линии электропередачи – 467,62 км;
- реактивная мощность - 584 МВАр.

В 2019 году по факту завершения строительства введено в эксплуатацию:



- трансформаторная мощность – 2 641 МВА;
- линии электропередачи – 771,39 км;
- реактивная мощность – 584 МВАр.

Программа ввода мощностей в эксплуатацию в 2019 году выполнена на 123,68%. Целевой показатель (95%), установленный по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 01.03.2018 № Ц/02, достигнут.

Ввод мощностей в эксплуатацию по разделам инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»:

№ п/п	Наименование раздела инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год	Фактические показатели ввода мощностей в эксплуатацию в 2019 году		
		трансформаторная мощность ПС	линии электропередачи	реактивная мощность
		МВА	км	МВАр
	Всего по инвестиционной программе:	2 641,00	771,39	584,00
1.	Технологическое присоединение	2 330,00	742,79	584,00
2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	311,00	23,29	0,00
3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0,00	5,31	0,00
4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие инвестиционные проекты	0,00	0,00	0,00

Физические показатели объектов, введенных в эксплуатацию в 2019 году, в региональном разрезе приведены ниже:

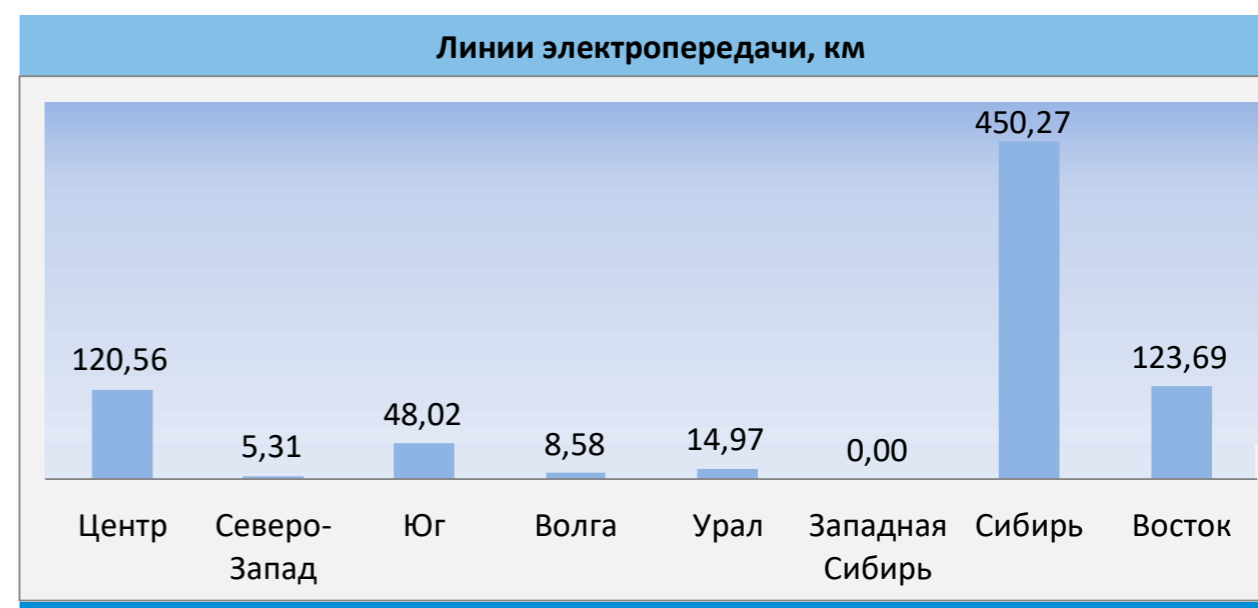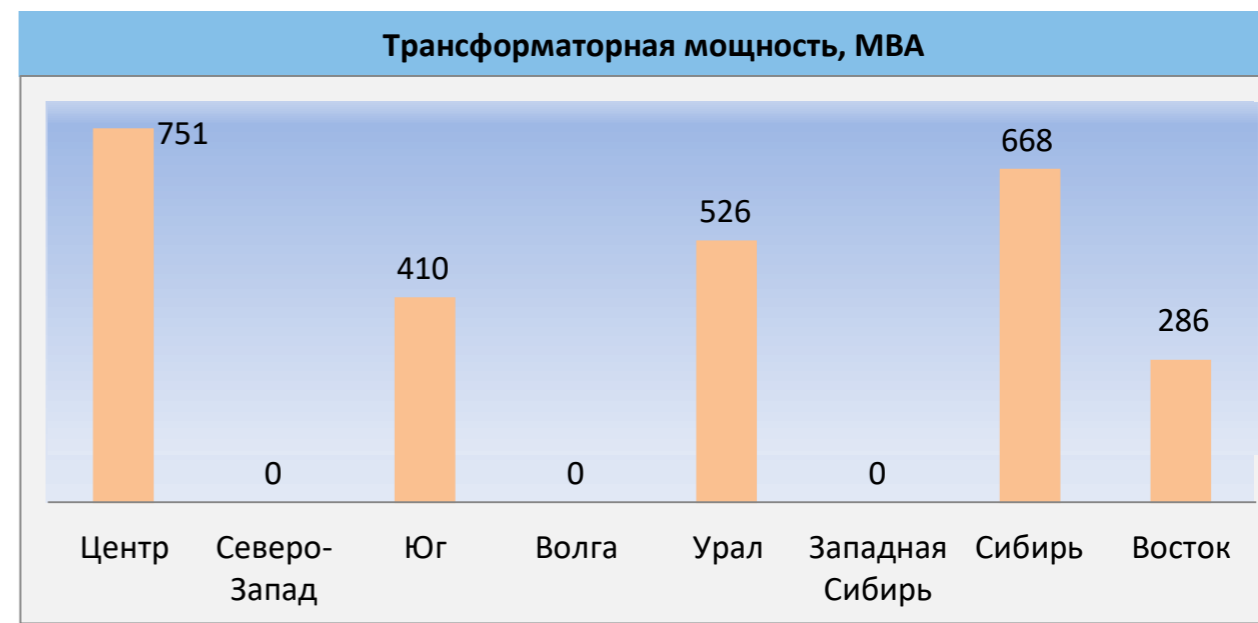

В 2019 году был осуществлен ввод в эксплуатацию ряда объектов, относящихся к реализации программы развития и модернизации учета электрической энергии (мощности), а также прочих инвестиционных проектов.

В рамках реализации программы «Обеспечение защиты объектов электроэнергетики» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 2019 года произведен ввод законченных строительством объектов в состав основных средств по следующим титулам:

- «Реконструкция ПС 500 кВ Камала-1, в рамках программы «Обеспечение защиты объектов электроэнергетики» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири);

- «Реконструкция ПС 220 кВ ЦРП в рамках программы «Обеспечение защиты объектов электроэнергетики» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири);
- «Реконструкция ПС 220 кВ Центр в рамках программы «Обеспечение защиты объектов электроэнергетики» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири).

Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году:

ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 – Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка

Регион:

Воронежская область

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 125 МВА
Протяженность линии - 121,36 км

Эффект:

Реализована выдача мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС в единую энергосистему страны, а также повышена надежность электроснабжения южной и восточной частей Центрально-Черноземного региона.



Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Пахра

Регион:

Московская область

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 500 МВА
Протяженность линии - 5,67 км

Эффект:

Устранены существовавшие ограничения пропускной способности присоединенных линий электропередачи и дополнительно повышена надежность электроснабжения потребителей Московской области.



Реконструкция ПС 220 кВ Вышестеблиевская с увеличением трансформаторной мощности на 125 МВА до 375 МВА для ТП ПАО «Кубаньэнерго»

Регион:

Краснодарский край

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 125 МВА

Эффект:

Повышена надежность электроснабжения потребителей Краснодарского края.



Реконструкция ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 с образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1

Регион:

Республика Кабардино-Балкария

Характеристики:

Протяженность линии - 38,69 км

Эффект:

Сокращен дефицит электрической мощности в Северо-Осетинской энергосистеме более чем в 2,5 раза.



ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская (501 МВА, 5,69 км)

Регион:

Оренбургская область

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 501 МВА

Протяженность линии - 5,69 км

Эффект:

Повышены надежность работы энергосистемы региона и переток мощности между энергосистемами Урала и Волги, в том числе электроснабжение предприятий АО «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть»).



Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Брюховецкая» (замена АТ)

Регион:

Краснодарский край

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 125 МВА

Эффект:

Повышена надежность электроснабжения крупных предприятий пищевой промышленности Краснодарского края (кондитерского комбината «Кубань» и Тимашевского молочного завода компании «Вимм-билль-данн»).



Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира – Надеждинская ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ Тира на две линейные ячейки 220 кВ

Регион:

Иркутская область

Характеристики:

Протяженность линии - 138,64 км

Эффект:

Обеспечено надежное электроснабжение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также электропитание нефтеперекачивающих станций трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).



ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ

Регион:

Иркутская область

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 668 МВА

Реактивная мощность - 584 МВАр

Эффект:

Устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области и созданы дополнительные связи западного энергорайона Якутии с Единой энергетической системой России.



Реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальская с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин)

Регион:

Забайкальский край

Характеристики:

Протяженность линии - 1,029 км

Эффект:

Увеличен переток мощности между Республикой Бурятией и Забайкальским краем, а также повышена надежность электроснабжения потребителей, в числе которых объекты Транссибирской магистрали.



Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2 (в габаритах 500 кВ) с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС (протяженность 294,48 км, 1 линейная ячейка 220 кВ на ПС 500 кВ Усть - Кут)

Регион:

Иркутская область

Характеристики:

Протяженность линии - 294,48 км

Эффект:

Обеспечено надежное электроснабжение объектов трубопроводного транспорта ОАО «АК Транснефть» и его дочерних зависимых обществ, а также Восточного полигона ОАО «РЖД».



Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 с образованием ВЛ 220 кВ Амурская - НПС-26 и ВЛ 220 кВ Короли/т - НПС-26 с отпайкой на ПС Белогорск протяженностью 4,272 км (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Дальний Восток»)

Регион:

Амурская область

Характеристики:

Протяженность линии - 4,27 км

Эффект:

Обеспечено надежное электроснабжение нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).



Строительство двух одноцепных заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 с образованием ВЛ 220 кВ Ключевая - НПС-23 и ВЛ 220 кВ НПС-23 - Сиваки протяженностью 9,66 км (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Дальний Восток»)

Регион:

Амурская область

Характеристики:

Протяженность линии - 9,66 км

Эффект:

Обеспечено надежное электроснабжение нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).



Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская – Ледяная в ПП 220 кВ Зeya протяжённостью 12 км, строительство ПП 220 кВ Зeya (для ТП энергопринимающих устройств АО «ДРСК»)

Регион:

Амурская область

Характеристики:

Протяженность линии - 17,76 км

Эффект:

Обеспечено электроснабжение Амурского ГПЗ – ключевого звена цепочки перспективных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».



Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «Транснефть-Восток») с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА

Регион:

Республика Саха (Якутия)

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 80 МВА

Эффект:

Повышена надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).



Реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «Транснефть-Восток») с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА

Регион:

Республика Саха (Якутия)

Характеристики:

Трансформаторная мощность - 80 МВА

Эффект:

Повышена надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).



Строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан № 1 с отпайкой на ПС Икура/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32 протяженностью 4,265 км (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Дальний Восток»)

Регион:

Амурская область

Характеристики:

Протяженность линии - 4,27 км

Эффект:

Обеспечено надежное электроснабжение нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).



Строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 № 1 с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Амга протяженностью 13,578 км, строительство ПП 220 кВ Амга (для ТП энергопринимающих устройств АО «ДРСК»)

Регион:

Амурская область

Характеристики:

Протяженность линии - 13,57 км

Эффект:

Повышена надежность электроснабжения объектов магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО).



7.2.1.2. Постановка объектов под напряжение в 2019 году

В соответствии с планом ввода в 2019 году планировалось поставить под напряжение:

- трансформаторная мощность – 2 801 МВА;
- линии электропередачи – 2 172,22 км;
- реактивная мощность – 412 МВАр.



Фактически в 2019 году поставлено под напряжение:

- трансформаторная мощность – 2 801 МВА;
- линии электропередачи – 2 071,45 км;
- реактивная мощность – 579 МВАр.

Постановка объектов под напряжение по разделам инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»:

№ п/п	Наименование раздела инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год	Фактические показатели ввода мощностей (ППН) в 2019 году		
		трансформаторная мощность ПС	линии электропередачи	реактивная мощность
		МВА	км	МВАр
Всего по инвестиционной программе:		2 801,00	2 071,45	579,00
1.	Технологическое присоединение	2 149,00	1 722,77	232,00
2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	126,00	9,28	0,00
3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	526,00	339,40	347,00
4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие инвестиционные проекты	0,00	0,00	0,00

Физические показатели объектов, поставленных под напряжение в 2019 году, в региональном разрезе приведены ниже:

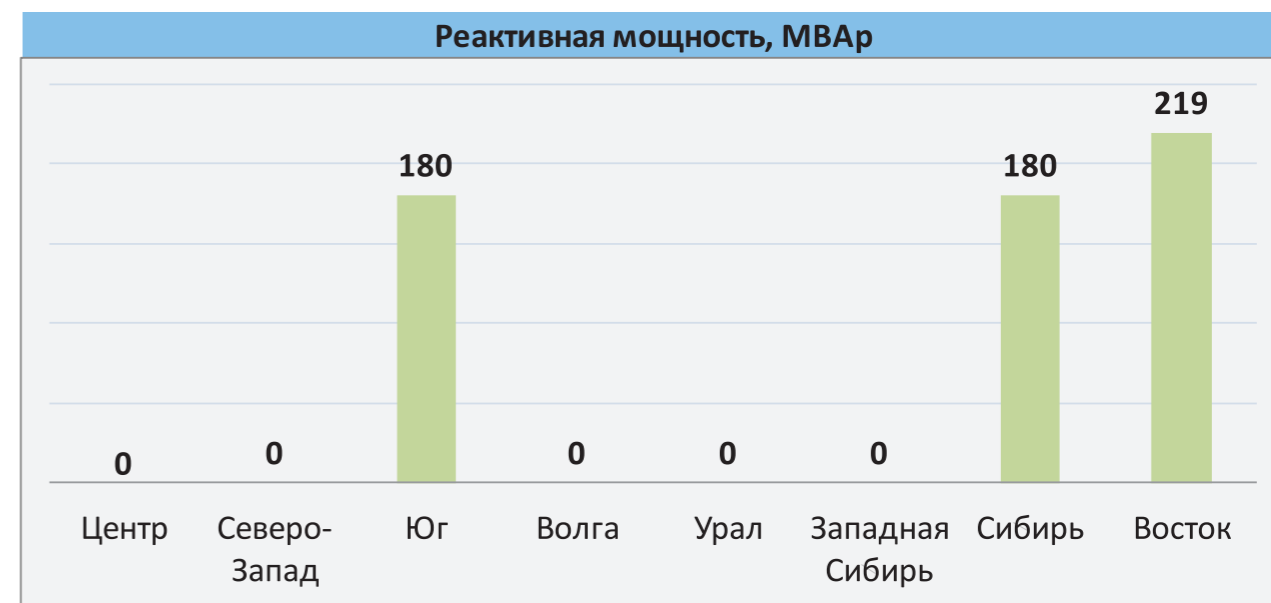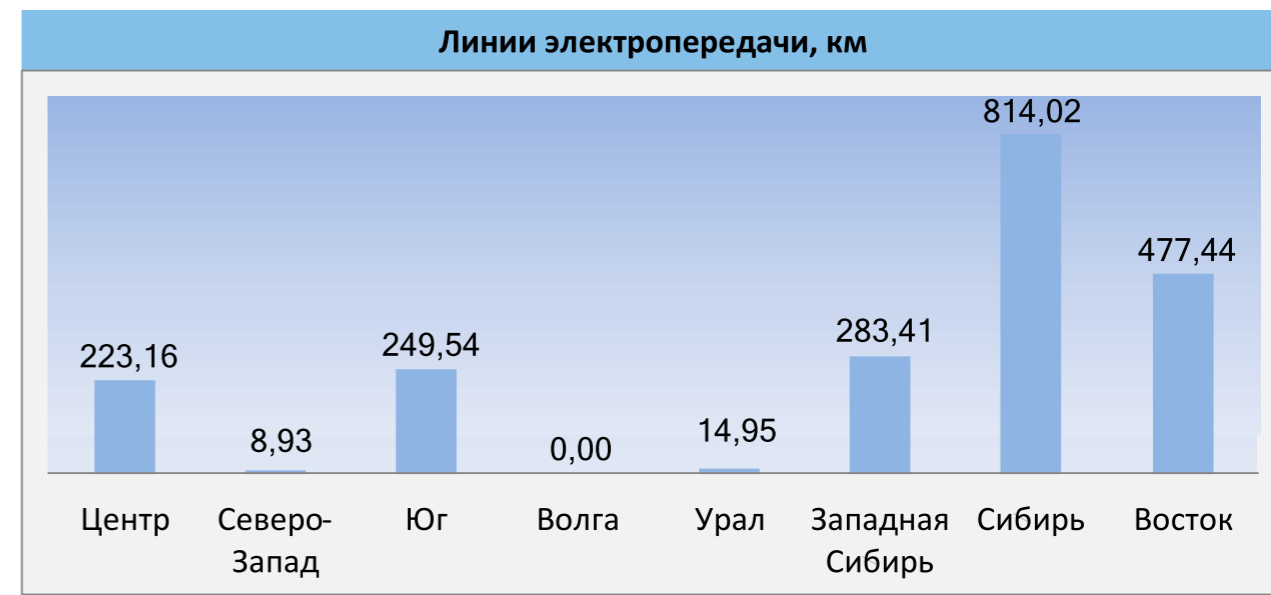

Программа постановки под напряжение в 2019 году в части основных показателей (МВА, км, МВАр) выполнена на 111,96%, в том числе:

- трансформаторной мощности на 100%;
- линий электропередач на 95,36%;
- реактивной мощности на 140,53%.

В части линейных объектов, непоставленных под напряжение:

- «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ–тяга (139,10 км)».

Отклонение от установленных планов постановки объекта под напряжение произошло вследствие переноса сроков из-за сложной режимной обстановки.

7.2.1.3. Освоение капитальных вложений в 2019 году

План освоения капитальных вложений на 2019 год составил 67 443,06 млн. руб. без НДС.

Фактическое освоение капитальных вложений в 2019 году составило 64 061,76 млн. руб. без НДС (95% от плана), с учетом экономии освоение капитальных вложений составило 98,1% от плановых значений.

Освоение капитальных вложений по разделам инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»:

№ п/п	Наименование раздела инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год	Освоение капитальных вложений за 2019 год, млн. руб, без НДС
	Всего по инвестиционной программе:	64 061,76
1.	Технологическое присоединение	46 090,34
2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	8 530,51
3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	8 937,46
4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	2,07
5.	Прочие инвестиционные проекты	501,38

Отклонение от установленных планов освоения капитальных вложений в 2019 году произошло вследствие следующих основных причин:

- сложившаяся экономия по факту ввода объектов в основные средства;
- необходимость корректировки проектно-сметной документации по причине изменения технических решений и выделения этапности;
- неисполнение обязательств подрядчиками в части соблюдения графика строительства.

7.2.1.4. Финансирование инвестиционной программы в 2019 году

План финансирования на 2019 год составил 82 175,22 млн. руб. с НДС.

Фактическое финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году в части проектов и программ, реализуемых АО «ЦИУС ЕЭС», составило 79 512,78 млн. руб. с НДС (96,7 % от плана).

Финансирование по разделам инвестиционной программы:

№ п/п	Наименование раздела инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год	Финансирование за 2019 год, млн. руб. с НДС
	Всего по инвестиционной программе:	79 512,78
1.	Технологическое присоединение	56 825,68
2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	10 249,93
3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	11 814,86
4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	16,38
5.	Прочие инвестиционные проекты	605,93

В соответствии с целевыми показателями, установленными по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» от 01.03.2018 № Ц/02, данный показатель признается выполненным.

7.3. Производственная деятельность в части реализации инжиниринговых функций

Опираясь на знания и опыт, полученные в течение одиннадцати лет при выполнении функций заказчика-застройщика и технического заказчика, АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году продолжило развитие инжиниринговых компетенций, выступая в качестве генерального подрядчика при реализации следующих проектов:

- строительство электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым по государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС (далее – Государственный контракт) в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;
- строительство объекта «Подстанции 500 кВ ЗапСиб (ПС 500/110 кВ), главные понизительные подстанции 110 кВ (ГПП) ГПП-1, ГПП-2, кабельные эстакады 110 кВ (КРУЭ 110 кВ – ГПП-1, КРУЭ 110 кВ – ГПП-2)» в рамках строительства объекта «Западно-Сибирский комплекс глубокой углеводородной переработки сырья в полиолефины мощностью 2 млн. тонн в год»;
- строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская»;
- создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково»;
- две ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б, расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская;
- ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок;
- разработка проектной документации по объекту «Подстанция «ПС 500 кВ АГХК», главные понизительные подстанции «ПС 110 кВ ГПП-1», «ПС 110 кВ ГПП-2», линии электропередачи «ЛЭП 110 кВ АГХК - ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК - ГПП-2»;
- разработка проектной документации для объектов по титулу «Строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кВ (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Амурский ГХК»);
- разработка рабочей документации, авторский надзор, оформление ЗПО, выполнение СМР, ПНР, поставка МТРИО по объекту АО «Кубанские магистральные сети» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Армавир – Центральная» в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки ВЛ 220 кВ «Армавир – Центральная» до РУ 220 кВ ПС 220 кВ Ветропарк с образованием двух новых ВЛ 220 кВ Армавир – Ветропарк и ВЛ 220 кВ Центральная – Ветропарк»;
- осуществление технического надзора и строительного контроля за качеством и соответствием требованиям законодательства в области

строительства работ по обустройству, перепланировке и переоборудованию нежилых помещений офисного назначения, выполняемых АО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ» в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1.

В рамках реализации Государственного контракта в 2019 году АО «ЦИУС ЕЭС» выполняло работы по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань). По данному объекту в 2019 году была выполнена корректировка проектной документации и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В 2020 году АО «ЦИУС ЕЭС» планирует выполнить работы, предусмотренные скорректированным проектом, который включает инженерную защиту опор ВЛ в зоне затопления паводковыми водами и оснащение участков ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань системой маркировки фазных проводов и грозозащитных тросов ЛЭП.

В 2020 году АО «ЦИУС ЕЭС» планирует завершение работ по Государственному контракту в полном объеме. Успешная реализация Государственного контракта позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Крымского федерального округа за счет перетока мощности из Единой энергетической системы России.

В рамках реализации проекта по строительству объекта «Подстанции 500 кВ ЗапСиб (ПС 500/110 кВ), главные понизительные подстанции 110 кВ (ГПП) ГПП-1, ГПП-2, кабельные эстакады 110 кВ (КРУЭ 110 кВ – ГПП-1, КРУЭ 110 кВ – ГПП-2)» в 2019 году выполнены работы по корректировке рабочей документации, на основании которой оформлены итоговые акты о приемке выполненных работ. Подписание акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 планируется в 1 квартале 2020 года.

В рамках реализации договора генподряда с ПАО «ФСК ЕЭС» на строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская в 2019 году выполнены работы по строительству ячейки № 3 и перезаводу ВЛ 220 кВ Брянская – Литейная, монтаж и ввод в работу нового ТН 220 кВ в ячейку № 9 на ПС 220 кВ Брянская. Завершено строительство здания ОПУ модульного исполнения на ПС 220 кВ Брянская.

В 2020 году планируется завершение работ по реконструкции ПС 220 кВ Брянская, ПС 500 кВ Елецкая, ПС 220 кВ Машзавод. На ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и на ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская будут выполнены работы по устройству ледовой защиты, на ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская – работы по монтажу систем жестких анкерных линий.

В результате реализации данного проекта появится возможность увеличения мощности крупных промышленных производств, таких как Брянский машиностроительный завод, Бежицкий сталелитейный завод, Брянский автомобильный завод. Будут созданы условия для новых технологических присоединений, что обеспечит благоприятный инвестиционный климат в Брянской и Калужской областях, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества жизни населения.



В 2019 году АО «ЦИУС ЕЭС» продолжило реализацию проекта «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» по договору с ПАО «ФСК ЕЭС». В 2019 году по 10 этапу проекта введены в эксплуатацию: 1 соединительный пункт, 4 трансформаторные подстанции общей мощностью 20 МВА, кабельные линии 20 кВ общей протяженностью 14,82 км, которые обеспечили технологическое присоединение ITCluster.

В 2020 году АО «ЦИУС ЕЭС» планирует осуществить строительство объектов, которые позволят обеспечить 30 трансформаторных подстанций и два распределительных пункта общей трансформаторной мощностью 75,86 МВА, а также выполнить прокладку кабельных линий протяженностью 78,32 км.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить своевременное технологическое присоединение терапевтического корпуса Международного

медицинского кластера, офисного центра Технопарк, жилых зданий, спортивного и ледового центра, творческого и студенческого квартала.

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» завершение реализации проекта планируется в 2020 году.



В рамках реализации договора генподряда с ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту «Две ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б, расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская» в 2019 году АО «ЦИУС ЕЭС» обеспечило подключение потребителя к электрическим сетям по постоянной схеме и организовало оптический канал связи, благодаря которому обеспечен доступ к высокоскоростному интернету на объектах потребителя.

В 2019 году на ПС 220 кВ Эльгауголь завершены работы в зданиях ЗРУ 220 кВ, совмещенном с ОПУ, и ЗРУ 110 кВ, совмещенном с ЗРУ 35 кВ. На ПС 220 кВ Призейская завершены работы в здании ОПУ-2, завершено устройство ОРУ.

ПС 220 кВ Эльгауголь сооружается в труднодоступном горном районе юго-восточной части Республики Саха (Якутия) и предназначена для электроснабжения Эльгинского угольного комплекса, одного из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. Присоединение ПС 220 кВ Эльгауголь к электрической сети осуществляется двумя одноцепными ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь. Реконструируемая ПС 220 кВ Призейская принадлежит энергосистеме Амурской области, которая будет являться источником электроснабжения для угольного месторождения. В 2020 году АО «ЦИУС ЕЭС» планирует ввод в эксплуатацию в объеме первого этапа строительства.



В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Северо-Кавказского федерального округа АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году продолжило реализацию договоров с ПАО «ФСК ЕЭС» на строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок протяженностью 265 км.

Трасса ВЛ проходит по территории трех субъектов РФ: Ставропольского края, республик Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.

В рамках реализации проекта в 2019 году выполнен монтаж фундаментов на 306 пикетах, установлено 407 опор и смонтировано 161,5 км провода. Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок завершены в полном объеме, выполнены пусконаладочные работы и проведено комплексное опробование.

Ввод в состав основных средств ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок запланирован в 2020 году. Подключение к центрам питания ВЛ обеспечит передачу мощности Ростовской АЭС и Ставропольской ГРЭС в энергосистемы семи регионов Северного Кавказа с населением около 10 млн. человек.



В 2019 году в рамках реализации проекта по разработке проектной документации для ООО «Амурский ГХК» по объекту «Подстанция «ПС 500 кВ АГХК», главные понизительные подстанции «ПС 110 кВ ГПП-1», «ПС 110 кВ ГПП-2», линии электропередачи «ЛЭП 110 кВ АГХК - ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК - ГПП-2» проведены изыскательские работы и осуществлена разработка проектной документации. В 2020 году планируется провести согласование проектной документации с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока и филиалом АО «СО ЕЭС» - ОДУ Востока, а также обеспечить сопровождение проектной документации при прохождении ООО «АГХК» экологической и государственной экспертизы. Разработка проектной документации в рамках реализации данного проекта необходима для строительства в Свободненском районе Амурской области Амурского газохимического комплекса.

В 2019 году в рамках реализации проекта по разработке проектной документации для объектов по титулу «Строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кВ (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Амурский ГХК»)» по договору с ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечен сбор исходных данных и проведено предпроектное обследование. В 2020 году планируется проведение изыскательских работ, разработка проектной документации и проведение Государственной экспертизы проекта. Разработка проектной документации в рамках реализации данного проекта необходима для обеспечения технологического присоединения ПС 500 кВ «АГХК».

В рамках реализации договора генподряда с АО «Кубанские магистральные сети» по объекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ «Армавир – Центральная» в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки ВЛ 220 кВ «Армавир – Центральная» до РУ 220 кВ ПС 220 кВ Ветропарк с образованием двух новых ВЛ 220 кВ «Армавир – Ветропарк» и ВЛ 220 кВ «Центральная – Ветропарк» в декабре 2019 года АО «ЦИУС ЕЭС» обеспечило ввод в эксплуатацию двух участков ВЛ протяженностью 16 км, необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПС 220 кВ Ветропарк, построенной АО «ВетроОГК» для подключения 60 ветроустановок Адыгейской ВЭС.



8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Уставный капитал АО «ЦИУС ЕЭС» составляет 833 000 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на 31.12.2019 составляет 145 491 тыс. рублей.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала АО «ЦИУС ЕЭС»:

Период	Ед. изм.	Уставный капитал АО «ЦИУС ЕЭС»	Стоимость чистых активов
2017	тыс. руб.	833 000	1 066 484
2018	тыс. руб.	833 000	990 916
2019	тыс. руб.	833 000	145 491

Из приведенной таблицы видно, что по состоянию на 31.12.2019 стоимость чистых активов АО «ЦИУС ЕЭС» меньше величины уставного капитала.

Уменьшение стоимости чистых активов произошло в результате получения по итогам работы в 2019 году убытка в размере 845 425 тыс. руб.

Основные причины убытка:

- взыскание с АО «ЦИУС ЕЭС» стоимости потерь электроэнергии в размере 416 624 тыс. руб. на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-64524/18-138-461 в пользу Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Объединенная электросетевая компания»;

- взыскание с АО «ЦИУС ЕЭС» денежных средств в размере 131 405 тыс. руб. для возмещения затрат по признанному судом акту выполненных работ на основании решения Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-175098/2018 в пользу ОАО «ЭНЕКС».

Указанные выше расходы, связанные с взысканием с АО «ЦИУС ЕЭС» денежных средств по решениям судов, возникли в процессе строительства АО «ЦИУС ЕЭС» электросетевого энергообъекта Российская Федерация – полуостров Крым по государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года.

- создание резерва по сомнительным долгам в отношении ООО «Автобан – Тамань» в размере 394 025 тыс. руб. в связи с введением в отношении контрагента процедуры наблюдения. ООО «Автобан – Тамань» выполняло работы по договору подряда при реализации инжинирингового проекта «Две ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б, расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская».

Для покрытия убытка и восстановления стоимости чистых активов до размера уставного капитала АО «ЦИУС ЕЭС» разработана и утверждена

Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания от 17.12.2019 № 204) Программа финансового оздоровления. Мероприятия Программы финансового оздоровления направлены на оптимизацию расходов, повышение доходов от реализации инжиниринговой деятельности и работу с проблемной дебиторской задолженностью, в отношении которой созданы резервы по сомнительным долгам. Реализация Программы финансового оздоровления будет способствовать улучшению финансового состояния Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Принципы дивидендной политики АО «ЦИУС ЕЭС» закреплены в нормативном документе «Положение о дивидендной политике АО «ЦИУС ЕЭС», утвержденном решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» 13 февраля 2019 года (протокол от 13.02.2019 № 181).

Дивидендная политика АО «ЦИУС ЕЭС» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, направлена на повышение инвестиционной привлекательности АО «ЦИУС ЕЭС», его капитализации и максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.

Дивидендная политика АО «ЦИУС ЕЭС» основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного управления;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы дивидендных выплат для акционеров и менеджеров.

С полным текстом Положения о дивидендной политике АО «ЦИУС ЕЭС», можно ознакомиться на корпоративном сайте:

<http://www.cius-ees.ru/shareholder/documents/>.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации дивиденды выплачиваются из чистой прибыли АО «ЦИУС ЕЭС», рассчитанной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

В структуре распределения чистой прибыли за отчетный финансовый год выделяются средства на обязательные для АО «ЦИУС ЕЭС» отчисления в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними регламентирующими документами Общества, а также по другим направлениям ее расходования, в том числе на выплату дивидендов.

Решение о распределении прибыли принимается Общим собранием акционеров АО «ЦИУС ЕЭС».

Информация о распределении прибыли и дивидендах представлена в таблице ниже в соответствии с решениями следующих годовых Общих собраний акционеров Общества (ГОСА):

- ГОСА 2018 (за 2017 год) – протокол от 28.06.2018 № 1559;
- ГОСА 2019 (за 2018 год) – протокол от 25.06.2019 № 1641.

Распределение прибыли и дивидендов за 2017—2019 годы

Показатель, тыс. руб.	2017 факт	2018 факт	2019 план
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	286 229	-39 404	-845 425
в том числе:			
Резервный фонд	3 637	-	-
Фонд накопления	-	-	-
Дивиденды	36 163	-	-
Погашение убытков прошлых лет	90 758	-	-
Нераспределенная прибыль	155 670	116 266	-

По итогам 2017 финансового года годовым Общим собранием акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 № 1559) принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 0,04341327143 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 36 163 тыс. руб. осуществлена 21.02.2019.

По результатам работы за 2018 год Общим собранием акционеров Общества было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦИУС ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641) в соответствии с «Положением о дивидендной политике АО «ЦИУС ЕЭС» в связи с полученным убытком.

В соответствии с отчетом АО «ЦИУС ЕЭС» о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2019 год убыток составил 845 425 тыс. руб.

Решение о выплате (невыплате) дивидендов за 2019 год будет приниматься годовым Общим собранием акционеров АО «ЦИУС ЕЭС» в 2020 году.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «ЦИУС ЕЭС»
Почтовый адрес:	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Телефон:	+7 (495) 710-60-60
Место нахождения:	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Факс:	+7 (495) 710-82-01
E-mail:	CIUS@fsk-ees.ru
Корпоративный сайт:	www.cius-ees.ru
Секретарь Совета директоров	Жилин Алексей Максимович Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, каб. 319
Телефон:	+7 (495) 710-60-60, доб. 20-58

Аудитор АО «ЦИУС ЕЭС»

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «ФинЭкспертиза»
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:	Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Юридический адрес:	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком. 1.
Место нахождения:	г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, подъезд 3 (БЦ «Авион»)
Телефон:	+7 (495) 775-22-00
Факс:	+7 (495) 775-22-01
E-mail:	info@finexpertiza.ru
Корпоративный сайт:	http://finexpertiza.ru/

Регистратор АО «ЦИУС ЕЭС»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «СТАТУС»
Лицензия:	Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия
Место нахождения:	109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание бизнес-центра «Ринг парк»
Телефон:	(495) 974-83-45, 974-83-50
Факс:	(495) 678-71-10
E-mail:	office@rostatus.ru
Корпоративный сайт:	www.rostatus.ru

Приложение 1.1.
к Годовому отчету АО «ЦИУС ЕЭС»
по итогам 2019 года

Информация о крупных сделках, совершенных АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1.	Дополнительное соглашение от 18.04.2019 № 1 к договору от 28.12.2018 № 239 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (в части строительства 1-4 участков ВЛ)»	18.04.2019	Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ПАО «ФСК ЕЭС» Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 28.12.2018 № 239 в части: - замены предусмотренных Договором условий о предоставлении банковских гарантий на условия о предоставлении гарантийных писем в соответствии с п. 2.2 приказа ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2018 № 158; - замены условий о предоставлении Подрядчиком договора страхования, заключенного им со страховой компанией (пункт 17.1 Договора), условиями о предоставлении Подрядчиком Заказчику подписанного между Субподрядчиком и страховой компанией договора комбинированного страхования рисков, с указанием, что выгодоприобретателем является, в том числе	Протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 10.10.2019 № 198

¹ Цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг определяется Советом директоров АО «ЦИУС ЕЭС» исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
2.	Договор от 25.04.2019 № 07/4-433 на выполнение работ по техническому учету и инвентаризации с оплатой компенсационных выплат землепользователям в рамках объекта «Высоковольтная линия 330 кВ Западно-Крымская - Севастополь (схема будет уточнена проектом)	25.04.2019	<p>ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>- продления сроков завершения строительно-монтажных работ: Акт приемки законченного строительством Объекта 25.06.2019. Акт ввода в эксплуатацию 30.09.2019.</p> <p>Цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет не более 2 878 789 618 (Двух миллиардов восьмисот семидесяти восьми миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот восемнадцати) рублей 64 копеек.</p> <p>Срок выполнения работ: Срок окончания оказания услуг: 25.06.2019.</p> <p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> <p>Стороны договора: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «Энерго-Юг»</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по техническому учету и инвентаризации с оплатой компенсационных выплат землепользователям.</p> <p>Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 124 654 005 (Ста двадцати четырех миллионов шестисот пятидесяти четырех тысяч пяти) рублей 34 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.07.2019 № 1649/5/3

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
3.	Дополнительное соглашение от 14.05.2019 № 8 к договору от 13.12.2016 № 214-2016 на выполнение комплекса работ по титулу «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап»	14.05.2019	<p>Федерации.</p> <p>Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - с даты заключения; Срок окончания выполнения работ - 15.05.2019.</p> <p>Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 13.12.2016 № 214-2016 в части: - переноса срока завершения работ по договору до 31.12.2019 (подписание КС - 11 - 30.11.2019, КС - 14 - 31.12.2019); - уменьшения объемов работ и стоимости Договора до уровня 8 687 106 947,65 руб. с НДС; - внесение изменений в формулировки расчета НДС по причине изменения с 01.01.2019 ставки размера НДС с 18% до 20%; - обеспечение гарантийных обязательств в вид гарантийного письма на исполнение гарантийных обязательств. Страховое и финансовое обеспечение при заключении дополнительного соглашения должно соответствовать условиям заключенного договора и ОРД Общества. Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.11.2019 № 1665/3/1

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
4.	Дополнительное соглашение от 15.05.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	15.05.2019	№ 1-8 составляет не более 8 687 106 947 (Восемь миллиардов шестисот восьмидесяти семи миллионов ста шести тысяч девятисот сорока семи рублей) 65 копеек, в том числе НДС (20%) в размере не более 1 380 171 291 (Одного миллиарда трехсот восьмидесяти миллионов ста семидесяти одной тысячи двухсот девяноста одного) рубля 26 копеек. Срок выполнения работ: Срок окончания выполнения работ – 30.11.2019. Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу и становится неотъемлемой частью Договора со дня его подписания Сторонами. Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2019 № 1655/6
5.	Договор от 28.05.2019 № 07/3-102 на корректировку ПСД по титулу «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань). Корректировка»	28.05.2019	Стороны Договора: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «Энерго-Юг» Предмет Договора: Комплекс работ по корректировке ПСД, согласованию, обеспечению проведения экспертизы. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 10 000 (Десяти	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.07.2019 № 1649/5/1

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
6.	Дополнительное соглашение от 26.07.2019 № 1 к договору от 30.07.2018 № 07/3-96 на корректировку проектно-сметной документации по титулу «Высоковольтная линия 330 кВ Западно – Крымская – Севастополь (схема будет уточнена проектом). Корректировка»	26.07.2019	тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – в размере не более 1 666 (Одной тысячи шестисот шестидесяти шести) рублей 67 копеек. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - с даты заключения; Срок окончания выполнения работ - 20.08.2019. Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «Энерго-Юг» Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 30.07.2018 № 07/3-96 в части уменьшения цены Договора на 2 360 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС, за счет исключения затрат по оплате Государственной экспертизы по корректировке проектной документации, с корректировкой Календарного графика выполнения работ. Цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет не более 79 640 000 (Семидесяти девяти миллионов шестисот сорока тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок выполнения работ: Срок окончания выполнения работ – 30.10.2018.	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.07.2019 № 1647/1

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
7.	Дополнительное соглашение от 07.08.2019 № 13 к договору от 27.04.2015 № 259/7-15 на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРИО по титулу «Строительство подстанции 220 кВ № 4 (возможность расширения до подстанции 330 кВ)»	07.08.2019	<p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» АО «Гидроэлектромонтаж»</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 27.04.2015 № 259/7-15 в части: - уменьшения стоимости Договора на 39, 610 млн. руб. с НДС; - корректировки Спецификации оборудования и материалов (Приложение 24 к Договору) с исключением Стойки контрольно-измерительного пункта КИП на сумму 79 865,39 руб. с НДС; - корректировки Сводной таблицы стоимости (Приложение 1 к Договору), корректировки Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), без изменения общего срока завершения работ по договору; - продажи Стойки контрольно-измерительного пункта КИП ЭФС на 20 измерительных и 4 силовые клеммы с БС30 КИП.ЭФС.1.2.8-4 БС310-2 в количестве 1 шт. стоимостью 79 865,39 руб. с НДС. Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-13 составляет не более 1 096 621 195 (Одного миллиарда девяносты шести миллионов шестисот двадцати одной тысячи ста девяносты пяти) рублей 70 копеек, в том числе НДС в</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.07.2019 № 1649/5/2

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
8.	Дополнительное соглашение от 26.08.2019 № 5 к договору от 21.12.2015 № 487/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР, поставке МТРИО 1-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская»	26.08.2019	<p>соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Срок выполнения работ: Срок окончания выполнения работ – 31.12.2016.</p> <p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 21.12.2015 № 487/ИД в части: - перераспределения затрат с уменьшением стоимости Договора на сумму не более 111 814 292,06 рублей до уровня не более 3 185 752 464,67 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации; - внесения обязательств подрядчика по предоставлению гарантийного письма на обеспечение обязательств в гарантийный период, без изменения иных условий Договора. Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-5 составляет не более 3 185 752 464 (Трех миллиардов ста восьмидесяти пяти миллионов семисот пятидесяти двух тысяч четырехсот шестидесяти четырех) рублей 67 копеек, в том числе НДС</p>	Протокол заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» от 03.02.2020 № 209

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о сделке или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
9.	Договор от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций технического заказчика в редакции дополнительного соглашения от 27.08.2019 № 1	27.08.2019	<p>по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.</p> <p>Срок выполнения работ – 31.12.2016.</p> <p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>Предмет Договора: По Договору Технический заказчик обязуется от имени и за счет Компании, осуществлять юридические и иные действия по выполнению функций технического заказчика по строительству и реконструкции на всех этапах инвестиционного процесса по объектам, принадлежащим Компании на праве собственности, а также Объектам, в отношении которых Компания, уполномочена осуществлять действия по их созданию (строительству, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, реновации) согласно перечню в задании Компании. Компания обязуется оплатить Техническому заказчику оказанные услуги в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. Технический заказчик является членом следующих</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2020 № 1690/10

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о сделке или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>саморегулируемых организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СРО Ассоциация строительных организаций «Поддержка организаций строительной отрасли»; - СРО Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» («Э.С.П.»). <p>Если иное не установлено условиями настоящего Договора, по сделкам, заключаемым Техническим заказчиком с третьими лицами, соответствующие договоры заключаются Техническим заказчиком от имени Компании (на основании выданной ему доверенности). При совершении сделок с третьими лицами по поручению Компании в рамках данного Договора Технический заказчик обязуется указывать в преамбуле ссылку на то, что действует в качестве Технического заказчика от имени, в интересах и за счет ПАО «ФСК ЕЭС» на основании настоящего Договора.</p> <p>При необходимости внесения изменений в перечень и объемы выполняемых Техническим заказчиком работ, порядок ценообразования, иные изменения условий настоящего Договора, Сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору с соблюдением всех условий получения соответствующих корпоративных одобрений Компании на совершение таких сделок.</p> <p>Оплата работ и услуг, выполненных/оказанных третьими лицами в связи с исполнением настоящего Договора осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим</p>	

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>Договором.</p> <p>Цена Договора: Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика на период с 01.03.2018 по 31.12.2020 составляет 6 564 861 958 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь рублей 59 копеек, кроме того НДС – 287 982 231 (Двести тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи двести тридцать один) рубль 24 копейки, а за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 составляет – 4 964 960 673 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) рубль 92 копейки, кроме того НДС – 992 992 134 (Девятьсот девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи сто тридцать четыре) рубль 78 копеек.</p> <p>Данный размер вознаграждения определен исходя из объема капитальных вложений, который Технический заказчик обязуется обеспечить за период действия Договора в размере 236 711 699 486 (Двести тридцать шесть миллиардов семьсот одиннадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч</p>	

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
10.	<p>Дополнительное соглашение от 23.09.2019 № 4 к договору поставки от 04.07.2016 № 144 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ТД «Авантаж»</p>	23.09.2019	<p>четыреста восемьдесят шесть) рублей 77 копеек без учета НДС.</p> <p>Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика состоит из постоянной части, а также переменной части.</p> <p>Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика на период с 01.03.2018 по 31.12.2020 подлежит уточнению на основании утвержденной корректировки инвестиционной программы Компании при изменении объема капитальных вложений с 01.03.2018 по 31.12.2020 по проектам, включенным в Задание Компании.</p> <p>Уточнение общего размера вознаграждения за услуги Технического заказчика оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.</p> <p>Срок оказания услуг по Договору: Срок начала оказания услуг: 01.03.2018; Срок окончания оказания услуг: 31.12.2020.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «ТД «Авантаж»</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор поставки от 04.07.2016 № 144 в части:</p>	<p>Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.04.2019 № 1627/4/3</p>

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
11.	Дополнительное соглашение от 30.09.2019 № 1 к договору от 04.05.2018 № 07/3-94 на выполнение корректировки ПСД по титулу «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская – Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань).	30.09.2019	<p>- уменьшения цены Договора на 28 550 169 (двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 62 копейки за счёт исключения поставки грозотроса (цена Договора составит 151 101 171 (сто пятьдесят один миллион сто одна тысяча сто семьдесят один) рубль 20 копеек с НДС);</p> <p>- возврата со стороны ООО «ТД «Авантаж» ранее выплаченного авансового платежа в размере возникшей переплаты.</p> <p>Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1-4 составит 151 101 171 (сто пятьдесят один миллион сто одна тысяча сто семьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС. НДС рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Срок поставки: Срок окончания поставки – 01.06.2017.</p> <p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «Энерго-Юг»</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 04.05.2018 № 07/3-94 в части: - уменьшения стоимости Договора на 5300 000,00 руб. с НДС за счет исключения затрат по оплате Государственной экспертизы, с</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 18.09.2019 № 1658/2

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
12.	Корректировка» Дополнительное соглашение от 05.11.2019 № 3 к договору от 26.04.2017 № 299/7-17 на выполнение СМР, ПНР, поставку МТРИО и разработку РД, для расширения ОРУ 500 кВ и 220 кВ в границах существующей ПС 500 кВ Тамань по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская –	05.11.2019	<p>корректировкой Календарного графика выполнения работ; и распространением действия Дополнительного соглашения с 01.01.2019;</p> <p>- изменения ставки НДС с 18% до 20% без изменения (увеличения) цены Договора, которая составит 92 200 000, 00 руб. с НДС и распространением действия дополнительного соглашения с 01.01.2019.</p> <p>Цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет не более 92 200 000 (Девяносто двух миллионов двухсот тысяч) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Срок выполнения работ: Срок окончания выполнения работ – 15.07.2018.</p> <p>Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, а в части изменения ставки НДС – с 01.01.2019.</p> <p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «ЛЭМ»</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 26.04.2017 № 299/7-17 в части: - изменения НДС с 18% до 20% и увеличением цены Договора относительно первоначальной на 792 625, 49 руб., с корректировкой Приложений к Договору и включением индивидуальных условий в части финансового обеспечения</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2019 № 1664/5

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)»		предусматривающее снижение суммы гарантийного депозита с 10% до 5% от цены Договора; - удержания гарантийного депозита до окончания гарантийного срока; - формирования гарантийного депозита в размере 5% от цены Договора одномоментно и выплатой освободившейся суммы гарантийного депозита в размере 60 333 878,37 руб., с актуализацией Соглашения о гарантийном депозите; - изменения сроков окончания выполнения работ, с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта, и получением Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию до 30 сентября 2019 года. Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-3 составляет не более 1 301 792 625 (Одного миллиарда трехсот одного миллиона семисот девяноста двух тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 49 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. Срок выполнения работ: Срок окончания выполнения работ – 30.09.2019. Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.	
13.	Дополнительное соглашение от 20.11.2019 № 1	20.11.2019	Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС»	Выписка из протокола заседания Правления

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	к договору от 25.04.2019 № 07/4-433 на выполнение работ по техническому учету и инвентаризации с оплатой компенсационных выплат землепользователям в рамках объекта «Высоковольтная линия 330 кВ Западно-Крымская-Севастополь (схема будет уточнена проектом)»		ООО «Энерго-Юг» Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 25.04.2019 № 07/4-433 в части: уменьшения цены работ по Договору на 25 738 877 рублей 54 копейки, в том числе НДС, с исключением из Договора обязательств по оформлению публичного сертификата на ООО «Энерго-Юг» и корректировкой приложений к Договору. Цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет не более 98 915 127 (Девяноста восемь миллионов девятисот пятнадцати тысяч ста двадцати семи) рублей 80 копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок выполнения работ: Срок окончания выполнения работ – 15.05.2019. Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.	ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.11.2019 № 1665/3/2
14.	Дополнительное соглашение от 26.11.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	26.11.2019	Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2019 № 1677/1/1
15.	Дополнительное соглашение от 26.11.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	26.11.2019	Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.02.2020 № 1682/7

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
16.	Договор от 28.11.2019 № 358/7-19 на выполнение объема работ по оснащению участков ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань системой маркировки фазных проводов и грозозащитных тросов ЛЭП в рамках титула «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская-Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань)»	28.11.2019	<p>Стороны: АО «ЦИУС ЕЭС» ООО «Стройсервис»</p> <p>Предмет Договора: По Договору Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтажу и наладке системы ночной маркировки фазных проводов и грозозащитных тросов ЛЭП; - приемке, хранению, доставке до мест монтажа давальческих материалов и оборудования Генподрядчика в соответствии с НТД и инструкциями завода-изготовителя; - подготовке комплекта исполнительной документации по выполненным работам; - обеспечению гарантийных обязательств на выполненные работы в течение гарантийного срока. <p>Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 33 300 000 (Тридцати трёх миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.</p> <p>Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - с даты заключения; Срок окончания выполнения работ - 31.12.2019.</p> <p>Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует</p>	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.02.2020 № 1681/8

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
17.	Дополнительное соглашение от 16.12.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	16.12.2019	до полного исполнения сторонами своих обязательств. Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2020 № 1683/3/3
18.	Дополнительное соглашение от 24.12.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	24.12.2019	Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2020 № 1683/3/1
19.	Дополнительное соглашение от 24.12.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	24.12.2019	Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2020 № 1683/3/4
20.	Дополнительное соглашение от 25.12.2019 № 6/н к Государственному контракту от 01.10.2015 № 80.КС	25.12.2019	Внесение изменений в Государственный контракт от 01.10.2015 № 80.КС	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2020 № 1683/3/2

Информация о сделках, совершенных АО «ЦИУС ЕЭС» в 2019 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1.	Дополнительное соглашение от 28.02.2019 № 1 к договору от 31.03.2017 № 7-4770 на услуги по технической поддержке компьютерной техники, сетевого и серверного оборудования	28.02.2019	Стороны Дополнительного соглашения: АО «ЦИУС ЕЭС»; ООО «Айти Энерджи Сервис». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 31.03.2017 № 7-4770 на услуги по технической поддержке компьютерной техники, сетевого и серверного оборудования без изменения общей стоимости услуг по Договору. Общая стоимость услуг по Договору составляет 29 110 312 (Двадцать девять миллионов сто десять тысяч триста двенадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС (НДС рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации).	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» – лицо – ПАО «Россети» (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо – ООО «Айти Энерджи Сервис» (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке с АО «ЦИУС ЕЭС».	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 05.12.2018 № ЦО/ВВ/474	В Уставленном об АО срок требования не поступили

² Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
2.	Дополнительное соглашение от 28.02.2019 № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 29.08.2017 № 461566	28.02.2019	Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания представителями Сторон и действует до 29.02.2020. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 29.08.2017 № 461566. Цена Дополнительного соглашения: Балансовая стоимость передаваемого имущества: По состоянию на 31.12.2018 балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества составляет 61 019 384 (Шестьдесят один миллион девятнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 79 копеек. Арендная плата состоит из фиксированной и переменной частей. С 01.01.2019 фиксированная часть месячной	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Филимонов Р.Е., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» – лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» – лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 06.02.2019 № ЦО/ВВ/185	В Уставленном об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>платы за аренду Объекта по настоящему Договору составляет 2 545 941 (Два миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок один) руб. 70 коп., в том числе НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ, и определена исходя из ставки арендной платы 11 068 (Одиннадцать тысяч шестьдесят восемь) руб. 48 коп. без учёта эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов за 1 (один) кв. м. в год, в том числе НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ, согласно отчету об оценке от 30.11.2018 № О-529, подготовленному ООО «Роосконсалтгрупп».</p> <p>Из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> – фиксированная часть месячной платы за аренду Объекта, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, составляет 1 768 447 (Один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок семь) руб. 94 коп., в том числе НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ; – фиксированная часть месячной платы за аренду Объекта, указанного в п. 2.1.2 настоящего Договора, составляет 777 493 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 76 коп., в том числе НДС по ставке, установленной 			

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>Налоговым кодексом РФ.</p> <p>Фиксированная часть арендной платы за пользование Объектом, указанным в п. 2.1.2 настоящего Договора, рассчитана с коэффициентом 0,315, определенным как отношение площади Объекта, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, к общей полезной площади Здания, равной 6080,32 кв. м.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019.</p>			

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
3.	Дополнительное соглашение от 11.03.2019 № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 № Б-4	11.03.2019	<p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «ЦИУС ЕЭС» в лице филиала АО «ЦИУС ЕЭС»-ЦИУС Центра (Арендатор).</p> <p>Предмет и цена Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в условия договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 № Б-4 в части изменения ставки НДС с 18% до 20%, установленной НК РФ. Арендная плата состоит из фиксированной и переменной части.</p> <p>С 01.01.2019 Фиксированная часть месячной платы за аренду Объекта, составляет 1 538 836 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 71 коп., в том числе НДС по ставке, установленной НК РФ. Сумма оплаты за неполный календарный месяц рассчитывается исходя из фактического количества дней пользования Объекта от общего количества дней в соответствующем месяце.</p> <p>Фиксированная часть арендной платы подлежит перечислению на расчетный счет Арендодателя до 15 (пятнадцатого) числа отчетного месяца.</p> <p>Обязательство Арендатора по внесению</p>	<p>Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Филимонов Р.Е., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.</p>	<p>Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 15.02.2019 № ЦО/ВВ/224</p>	<p>В установленном Законом об АО срок требования не поступили.</p>

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>арендной платы считается исполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Счет-фактура представляется Арендодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Переменной частью арендной платы являются: - коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, канализация, очистка вод, негативное влияние на систему водоотведения, техническая эксплуатация коллекторов), и электроэнергия; - уборка (очистка) Объекта, в т.ч. вывоз ТБО, дератизация, дезинфекция и дезинсекция; - услуги связи; - обслуживание инженерных систем Здания; - обслуживание систем пожарной безопасности Здания; - обеспечение охраны и пропускного режима Здания; - освещение объектов аренды (фасадное и уличное освещение с учетом расходных материалов), благоустройство прилегающей территории Здания; - услуги маршрутного транспорта; - прочие работы и услуги общепроизводственного характера (в том числе, текущие ремонтные</p>			

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
4.	Договор от 07.03.2019 № 552355 на выполнение работ по разработке, доработке рабочей документации по титулу «Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ	07.03.2019	<p>Стороны Договора: АО «ЦИУС ЕЭС» (Генеральный подрядчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Субподрядчик).</p> <p>Предмет Договора: Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработке рабочей документации в части ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь (1 цель и фундаменты 2-й цели). - Доработке рабочей документации по 1 этапу работ); <p>Переменная часть арендной платы в отношении Объекта рассчитывается пропорционально площади переданного во временное владение и пользование Арендатора Объекта.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019.</p>	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо - ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделке; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС»	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 15.02.2019 № ЦО/ВВ/230	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	Эльгауголь»		<p>строительства и разработку РД по 2 и 3 этапу строительства в части ПС 220 кВ Эльгауголь.</p> <p>Цена Договора: Цена договора не является твердой и не является приблизительной, предел цены договора составляет не более 113 792 597 (Сто тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. В цену договора входят все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе: вознаграждение Субподрядчика за отчуждение исключительных прав на результат работ в случае их возникновения, оплата счетов специализированных организаций.</p> <p>Срок выполнения работ по договору: Начало выполнения работ - с даты заключения договора; Окончание выполнения работ - 31 мая 2019 года.</p> <p>Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.</p>	лицо - ПАО «ФСК ЕЭС», которое одновременно является контролирующим лицом АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров, Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» Вадим В.Ф., одновременно являющийся представителем по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Корсунов П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Парышкура Д.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке;	лицо - ПАО «ФСК ЕЭС», которое одновременно является контролирующим лицом АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров, Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» Вадим В.Ф., одновременно являющийся представителем по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Корсунов П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Парышкура Д.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке;	лицо - ПАО «ФСК ЕЭС», которое одновременно является контролирующим лицом АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров, Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» Вадим В.Ф., одновременно являющийся представителем по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Корсунов П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Парышкура Д.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке;

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
5.	Договор от 28.03.2019 № 550033 возмездного оказания услуг по техническому надзору и строительному контролю	28.03.2019	<p>Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p>Предмет Договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательства в соответствии со статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации оказать услуги по техническому надзору и строительному контролю за качеством и соответствием требованиям законодательства в области строительства работ по обустройству, перепланировке и переоборудованию нежилых помещений офисного назначения (п. 1.4 Договора), выполняемых АО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ» в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, в рамках договора подряда б/н от 19.11.2018, заключенного с ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор подряда), а Заказчик обязуется оплатить их.</p> <p>Цена Договора:</p>	<p>- член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Этингер К.З., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке.</p> <p>Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Филимонов Р.Е., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.</p>	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 22.02.2019 № ЦО/ЧС/434	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>Цена Договора составляет сумму не более 21 600 000 (двадцать один миллион шестьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, из них: - стоимость 1 этапа (п. 5.1) – 14 404 694,56 рублей, в том числе НДС; - стоимость 2 этапа (п. 5.1) – 3 567 160,19 рублей, в том числе НДС; - стоимость 3 этапа (п. 5.1) – 1 316 293,8 рублей, в том числе НДС; - стоимость 4 этапа (п. 5.1) – 2 311 851,45 рублей, в том числе НДС.</p> <p>Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, и за весь период услуг не может превысить размер, установленный п. 4.1. Договора.</p> <p>Для целей исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору Заказчик обязуется в течение 10 (Десять) календарных дней с даты заключения Договора в качестве аванса перечислить Исполнителю денежные средства в размере 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом</p>			

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>Российской Федерации, при условии получения Заказчиком от Исполнителя надлежаще оформленного счета.</p> <p>Срок оказания Услуг: Исполнитель осуществляет технический надзор и строительный контроль в течение срока исполнения АО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ» всех обязательств по Договору подряда, начиная с 25.02.2019.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 25.02.2019, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p>			
6.	Договор о предоставлении возобновляемой заемной линии от 11.04.2019 № 554807	11.04.2019	<p>Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); АО «ЦИУС ЕЭС» (Заемщик).</p> <p>Предмет Договора: Стороны договорились о предоставлении займодавцем Заемщику в собственности денежных средств с лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных займов) не более 1 900 000 000 (Одного миллиарда девятьсот миллионов)</p>	<p>Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Филимонов Р.Е., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку Другое подконтрольное</p>	<p>Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 14.03.2019 № ЦО/ВВ/274</p>	<p>В установленном АО Законом об АО срок требования не поступили.</p>

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором.</p> <p>Заемные средства предоставляются Заемщику частями (далее именуется займы) на условиях, указанных в Заявлениях Заемщика, но не более 1 900 000 000 (Одного миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Суммы займов и периодичность платежей в счет возврата заемных средств и начисленных процентов указываются в графиках погашения займа и процентов по займу, являющихся неотъемлемой частью Договора, оформленных в виде Заявлений Заемщика, подписанных представителями Сторон.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора состоит из: - суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных займов) в размере не более 1 900 000 000 (Одного миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек. - суммы процентов по займу, рассчитанных по процентной ставке, указанной в заявлении</p>	<p>Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки</p> <p>ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.</p>		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>Заемщика, согласованного Заимодавцем, и равной действующей процентной ставке по заемному финансированию, привлеченному Заимодавцем для предоставления займа Заемщику плюс 1 (Один) процент. В случае если Заимодавец не осуществляет привлечение заемного финансирования для предоставления займа Заемщику, процентная ставка устанавливается равной средневзвешенной процентной ставке по внешним заимствованиям Заимодавца, действующей на первое число месяца, в котором осуществляется предоставление соответствующего займа плюс 1 (Один) процент.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</p> <p>Иные существенные условия Договора: Цель предоставления займов Заемщику: пополнение оборотного капитала АО «ЦИУС ЕЭС», погашение задолженности по Договору от 27.03.2015 № 6/н.</p> <p>Займы предоставляются на срок, согласованный в</p>			

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
7.	Дополнительное соглашение от 18.04.2019 № 1 к договору от 28.12.2018 № 239 на выполнение работ (СМНР, оборудование)	18.04.2019	<p>заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев с момента его выдачи и не может быть позже 31.12.2019.</p> <p>По согласованию Сторон срок возврата займа может быть изменен в порядке, предусмотренном п. 2.2 Договора, но в любом случае на срок не позднее 31.12.2019.</p> <p>Платежи в погашение процентов по выданным займам должны осуществляться ежеквартально в последний рабочий день соответствующего календарного квартала.</p> <p>В случае просрочки возврата займа и/или несвоевременной уплаты процентов по займу Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: АО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 28.12.2018 № 239 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту:</p>	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 09.04.2019 № ЦО/ВВ/396	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	по инвестиционному проекту ВЛ 500 кв Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кв Невинномысск и ПС 330 кв Моздок (сооружение ОРУ 500 кв) (в части строительства 1-4 участков ВЛ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор).		ВЛ 500 кв Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кв Невинномысск и ПС 330 кв Моздок (сооружение ОРУ 500 кв) (в части строительства 1-4 участков ВЛ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Общая цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет не более 2 878 789 618 (Двух миллиардов восьмисот семидесяти восьми миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот восемнадцати) рублей 64 копейки, а кроме того НДС НДС рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.	ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» - лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.		
8.	Дополнительное соглашение от 14.05.2019 № 8 к договору от 13.12.2016 № 214-2016 на	14.05.2019	Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 13.12.2016 № 214-2016 на выполнение комплекса работ по	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Филимонов Р.Е., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 15.03.2019	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	выполнение комплекса работ по титулу «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кв на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор).		титulu: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кв на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-8 составляет не более 8 687 106 947 (Восьми миллиардов шестисот восьмидесяти семи миллионов ста шесть тысяч девятьсот сорока семи) рублей 65 копеек, в том числе НДС в размере не более 1 380 171 291 (Одного миллиарда трехсот восьмидесяти миллионов ста семидесяти одной тысячи двухсот девяносто одного) рубля 26 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу и становится неотъемлемой частью Договора со дня его подписания Сторонами.	стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» - лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» - лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	№ ЦО/ВВ/283	
9.	Дополнительное соглашение от 17.05.2019 № 4 к договору от 23.08.2018 № 183 на выполнение работ	17.05.2019	Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 23.08.2018 № 183 с протоколом разногласий от 05.09.2018	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлены письмом от	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	(СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (на участке № 5: ПК 1476+20 – ПК 1669+49 (уг.53) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Общая цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 408 475 807 (Четырехсот восемь миллионов четырехсот семидесяти пяти тысяч восьмисот семи) рублей 95 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.		Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2019.	стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	29.04.2019 № ЦО/ВВ/492	

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
10.	Дополнительное соглашение от 17.05.2019 № 4 к договору от 23.08.2018 № 184 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (на участке № 6: ПК 1875+71 - ПК 2092+27 (уг. 55) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Общая цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 442 933 791 (Четырехсот сорока двух миллионов девятисот тридцати трех тысяч семисот девяносто одного) рубля 78 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.	17.05.2019	Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 23.08.2018 № 184 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту: ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (на участке № 6: ПК 1875+71 - ПК 2092+27 (уг. 55) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Общая цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 442 933 791 (Четырехсот сорока двух миллионов девятисот тридцати трех тысяч семисот девяносто одного) рубля 78 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлены письмом от 29.04.2019 № ЦО/ВВ/492	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
11.	Дополнительное соглашение от 17.05.2019 № 4 к договору от 23.08.2018 № 185 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ (сооружение ОРУ 500 кВ)	17.05.2019	Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 23.08.2018 № 185 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (на участке № 6: ПК 2092+27 - ПК 2234+98,1 (уг. 56), (на участке № 7: ПК 2234+98,1 – ПК 2296+74 (уг. 56а) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС». Общая цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 420 378 078 (четыре сотни двадцати миллионов триста семидесяти тысяч семьдесят восемь) рублей.	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлены письмом от 29.04.2019 № ЦО/ВВ/492	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
12.	Дополнительное соглашение от 17.05.2019 № 4 к договору от 23.08.2018 № 186 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ (сооружение ОРУ 500 кВ) (на участке № 7: ПК 2296+74 – ПК 2505+98 (ПС 500 кВ Моздок) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС».	17.05.2019	(на участке № 6: ПК 2092+27 - ПК 2234+98,1 (уг. 56), (на участке № 7: ПК 2234+98,1 – ПК 2296+74 (уг. 56а) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС».) Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 23.08.2018 № 186 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) (на участке № 7: ПК 2296+74 – ПК 2505+98 (ПС 500 кВ Моздок) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС». Общая цена работ по Договору с учетом	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»;	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлены письмом от 29.04.2019 № ЦО/ВВ/492	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
13.	расширением ПС 500 кв Невинномысск и ПС 330 кв Моздок (сооружение ОРУ 500 кв) (на участке № 7: ПК 2296+74 – ПК 2505+98 (ПС 500 кв Моздок)	17.05.2019	Дополнительное соглашение от 17.05.2019 № 4 к договору от 23.08.2018 № 187 с протоколом разногласий от 05.09.2018 на выполнение работ (СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кв Невинномысск – Моздок с расширением	дополнительного соглашения № 4 не является твердой и не является приблизительной, предел цены договора составляет не более 576 706 194 (Пятисот семидесяти шести миллионов семисот шести тысяч ста девяносто четырех) рублей 13 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2019.	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления АО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
14.	Договор от 22.05.2019 № 558949 на разработку	22.05.2019	(СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту ВЛ 500 кв Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кв Невинномысск и ПС 330 кв Моздок (сооружение ОРУ 500 кв) (на участке № 5: ПК 1669+47 – ПК 1845+91,1 (уг. 50), (на участке № 6: ПК 1845+91,1 - ПК 1875,71 (уг. 53а) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС».) Общая цена работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 743 217 705 (Семисот сорока трех миллионов двухсот семидесяти тысяч семисот пяти) рублей установленной налоговой законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2019.	другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС»	В установленном Законом об АО

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	проектной документации по объектам: «ПС 500 кВ АГХК», «ПС 110 кВ ГПП-1» «ПС 110 кВ ГПП-2», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-2»		<p>Предмет Договора: По Договору Субподрядчик обязуется на основании Задания 0008-009.2С на разработку Проектной документации по объектам: «ПС 500 кВ АГХК», «ПС 110 кВ ГПП-1», «ПС 110 кВ ГПП-2», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-2» в сроки, обусловленные планом-графиком выполнения работ, провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию по объектам: «ПС 500 кВ АГХК», «ПС 110 кВ ГПП-1», «ПС 110 кВ ГПП-2», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-2», включая Изыскательскую документацию, получение положительного заключения государственных экспертиз, в том числе метрологической экспертизы, и согласований компетентных государственных органов, а Подрядчик обязуется на условиях настоящего Договора принять и оплатить Результат выполненных Работ в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора составляет 99 499 058 (Девяносто девять миллионов четырехсот девяносто девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 45 копеек, кроме</p>	лицо - ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделке; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» одновременно является лицом АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Корсунов П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Паршикура Д.Н., одновременно являющийся членом Совета	АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 12.04.2019 № ЦО/ВВ/413	срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>того НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством. Договорная цена твердая, изменению не подлежит и включает в себя все налоги, сборы, комиссии банков. В Договорную цену входит вознаграждение Субподрядчика и все расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе вознаграждение Субподрядчика за отчуждение исключительных прав на Результат Работ, а также с выполнением работ, хотя прямо и не указанных, но обычно выполняемых для достижения Результата Работ, включая предвидимые или непредвидимые Субподрядчиком. Договорная цена является твердой и не подлежит увеличению в период производства Работ, в том числе в случае изменения налогового законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Субподрядчик не вправе требовать изменения твердой цены в сторону увеличения, в том числе в случаях, предусмотренных статьями 450, 709, 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p>	директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Этингоф К.З., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке.		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
15.	Дополнительное соглашение от 04.06.2019 № 4 к договору от 19.10.2016 № 529/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРИО 2-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с	04.06.2019	Стороны Дополнительного соглашения: АО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 19.10.2016 № 529/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРИО 2-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»;	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 19.04.2019 № ЦО/ВВ/438	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
16.	Дополнительное соглашение от 14.06.2019 № 2 к договору от 11.05.2018 № 514794 на выполнение работ по разработке/корректировке рабочей документации и авторского надзора по титулу «Строительство	14.06.2019	Стороны Дополнительного соглашения: АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 11.05.2018 № 514794 на выполнение работ по разработке/корректировке рабочей документации и осуществление авторского надзора по титулу «Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь» в части Расширения ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская между АО «ЦИУС ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор).	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо - ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделке; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо - ПАО «ФСК ЕЭС», которое одновременно является контролирующим лицом АО «НТЦ	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 29.05.2019 № ЦО/ВВ/587	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь» в части Расширения ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская		Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-2 составляет не более 21 700 000 (двадцати одного миллиона семисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством РФ. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.	ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров, Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС» Вадим В.Ф., одновременно являющийся представителем по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Корсунов П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НПЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Этингер К.З., одновременно являющийся членом Совета		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
17.	Дополнительное соглашение от 23.08.2019 № 5 к договору от 19.10.2016 № 529/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРИО 2-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с вводами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада. Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-5 составляет не более 2 866 495 961 (два миллиарда восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения:	23.08.2019	Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик) Предмет и цена: Внесение изменений в Договор от 19.10.2016 № 529/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРИО 2-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с вводами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада. Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-5 составляет не более 2 866 495 961 (два миллиарда восемьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения:	директоров АО «НПЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке. Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 25.07.2019 № ЦО/ЧС/1526	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
18.	Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада Дополнительное соглашение от 26.08.2019 № 5 к договору от 21.12.2015 № 487/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР, поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада. Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-5 составляет не более 3 185 752 464 (Три миллиарда сто восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством	26.08.2019	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 21.12.2015 № 487/ИД на выполнение незавершенных работ по разработке РД, выполнению СМР, ПНР, поставке МТРиО 1-й очереди строительства по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада. Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-5 составляет не более 3 185 752 464 (Три миллиарда сто восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 25.07.2019 № ЦО/ЧС/1527	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
19.	Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада Дополнительное соглашение от 27.08.2019 № 1 к договору от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций Технического заказчика	27.08.2019	Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); АО «ЦИУС ЕЭС» (Технический заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций Технического заказчика между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика на период с 01.03.2018 по 31.12.2020 составляет 6 564 861 958 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной Законодательством Российской Федерации. Размер вознаграждения в период с 01.03.2018 по 31.12.2018 составил – 1 599 901 284 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 25.07.2019 № ЦО/ЧС/1533	В установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>девятьсот одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 67 копеек, кроме того НДС – 287 982 231 (Двести восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести тридцать один) рубль 24 копейки, а за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 составляет – 4 964 960 673 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 92 копейки, кроме того НДС 992 992 134 (Девятьсот девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи сто тридцать четыре) рубля 78 копеек.</p> <p>Данный размер вознаграждения определен исходя из объема капитальных вложений, который Технический заказчик обязуется обеспечить за период действия договора в размере 236 711 699 486,77 руб. без НДС.</p> <p>Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика состоит из постоянной части, а также переменной части.</p> <p>Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика на период с 01.03.2018 по 31.12.2020 подлежит уточнению на основании утвержденной корректировки инвестиционной программы Компании при изменении объема</p>			

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
20.	<p>Договор от 20.09.2019 № 573707 на выполнение ПИР по инвестиционному проекту «Строительство ПП 500 кв Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кв (для ТП энергопринимающих устройств</p>	20.09.2019	<p>капитальных вложений с 01.03.2018 по 31.12.2020 по проектам, включенным в Задание Компании.</p> <p>Уточнение общего размера вознаграждения за услуги Технического заказчика оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> <p>Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019.</p> <p>Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» - (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» - (Подрядчик).</p> <p>Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке документации по планировке территории; - разработке Проектной документации и проведению экспертиз; - разработке Закупочной документации.</p>	<p>Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольтский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети», поскольку лицо – ПАО «Россети», поскольку другое ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС</p>	<p>Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 03.09.2019 № ЦО/ЧС/1815</p>	<p>В установленном Законом об АО срок требования не поступили.</p>

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	ООО «Амурский ГК»»		<p>Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору) и Задании на проектирование (приложение 6 к Договору).</p> <p>Цена Договора: Цена Договора не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 117 262 433 (Ста семнадцать миллионов двухсот шестидесяти двух тысяч четырехсот тридцати трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.</p> <p>В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результат Работ в случае их возникновения, оплата счетов Специализированных организаций и счетов</p>	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
21.	<p>Договор от 21.10.2019 № 201 на выполнение работ (разработка рабочей документацией, авторский надзор, оформление ЗПО, выполнение СМР, ПНР, поставка МТРИО) по объекту АО «Кубанские магистральные сети» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная» в</p>	21.10.2019	<p>Организаций по проведению экспертизы.</p> <p>Срок выполнения Работ: Начало выполнения Работ с момента заключения Договора. Окончание выполнения Работ «30» октября 2020 года.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.</p> <p>Стороны Договора: АО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).</p> <p>Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - по оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по оформлению земельно-правовых отношений на период эксплуатации; - по получению исходно-разрешительной Документации в объеме Договора; - по проведению технической инвентаризации и регистрации прав на вновь образованные ВЛ; - по урегулированию имущественно-правовых</p>	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «Россети» (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое контролирующее ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «Кубанские магистральные сети» является стороной по сделке; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку другое контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – АО «Кубанские магистральные сети» является	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 17.09.2019 № ЦО/ВВ/888	В Установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки ВЛ 220 кВ «Армавир - Центральная» до РУ 220 кВ ПС 220 кВ Ветропарк с образованием двух новых ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк и ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк»		отношений с собственниками объектов затронутых реконструкцией (при необходимости) с подготовкой отчета об оценке рыночной стоимости планируемого к демонтажу имущества и заключения соглашения о компенсации; - по разработке Рабочей документации; - по организации авторского надзора; - по реконструкции Объекта; - по метрологии (при необходимости); - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 474 739 767 (Четырехсот семидесяти четырех миллионов семисот тридцати девяти тысяч семисот шестидесяти семи) рублей 54 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговой	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
				стороной по сделке.		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
22.	Договор от 24.10.2019 № 577413 на выполнение ПИР по инвестиционному проекту «Строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кВ (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Амурский ГХК»)»	24.10.2019	законодательством Российской Федерации. Срок выполнения Работ: Начало выполнения Работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения Работ: 30.10.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Стороны Договора: АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Субподрядчик). Предмет Договора: По Договору Субподрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке документации по планировке территории; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Закупочной документации. Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 26.09.2019 № ЦО/ВВ/920	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.
				Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо - ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделке; лицо - ПАО «ФСК ЕЭС», которое одновременно является контролирующим лицом АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке, - член Совета директоров АО «ЦИУС	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			<p>последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору) и задании на проектирование (приложение 6 к Договору).</p> <p>Цена Договора: Цена Договора не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 111 399 311 (Сто одиннадцать миллионов трехсот девяноста девяти тысяч трехсот одиннадцати) рублей 40 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.</p> <p>В цену Договора входят все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: вознаграждение Субподрядчика за отчуждение исключительных прав на результат Работ в случае их возникновения, оплата счетов Специализированных организаций и счетов Организаций по проведению экспертизы.</p> <p>Срок выполнения Работ: Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.</p>	ЕЭС» Корсунюв П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Этингер К.З., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке.		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
23.	Дополнительное соглашение от 09.12.2019 № 1 к договору от 28.03.2019 № 550033 возмездного оказания услуг по техническому надзору и строительному контролю	09.12.2019	<p>Окончание выполнения Работ: 30.10.2020.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p>Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 28.03.2019 № 550033 возмездного оказания услуг по техническому надзору и строительному контролю между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения составит сумму не более 32 592 221 (Тридцать два миллиона пятьсот девяносто две тысячи двести двадцать один) руб. 08 коп., в том числе НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ, из них: – стоимость 1 этапа (п. 5.1) – 21 735 232,99 рублей в том числе НДС; – стоимость 2 этапа (п. 5.1) – 5 382 485,38 рублей в том числе НДС; – стоимость 3 этапа (п. 5.1) – 1 986 154,74</p>	Заинтересованные в совершении сделки лица: - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 18.11.2019 № ЦО/ВВ/1056	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			рублей в том числе НДС; – стоимость 4 этапа (п. 5.1) – 3 488 347,97 рублей в том числе НДС. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.			
24.	Дополнительное соглашение от 12.12.2019 № 4 к договору от 20.10.2017 № 482667 на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах»	12.12.2019	Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 20.10.2017 № 482667 на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования в объеме всех незавершенных работ по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя» в части строительства ПС 220 кВ Томмот и расширения ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор). Цена работ по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-4 составляет не более 1 813 600 390 (Одного миллиарда	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующие ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» - ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке. - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Мольский А.В., одновременно являющийся членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС».	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 29.05.2019 № ЦО/ВВ/583	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	Томмот - Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя» в части строительства ПС 220 кВ Томмот и расширения ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах		восемьсот тринадцать миллионов шестисот тысяч трехсот девяноста рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере не более 276 650 906 (Двухсот семидесяти шести миллионов шестисот пятидесяти тысяч девятисот шести) рублей 95 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, связанных с исполнением договора.			
25.	Дополнительное соглашение от 19.12.2019 № 1 к договору от 21.10.2019 № 201 на выполнение работ (разработка рабочей документации, авторский надзор, оформление ЗПО, выполнение СМР, ПНР, поставка МТРИО) по объекту ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная» в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки ВЛ 220 кВ «Армавир - Центральная» до РУ 220 кВ ПС 220 кВ Ветропарк с	19.12.2019	Стороны Дополнительного соглашения: АО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 21.10.2019 № 201 на выполнение работ (разработка рабочей документации, авторский надзор, оформление ЗПО, выполнение СМР, ПНР, поставка МТРИО) по объекту ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная» в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки ВЛ 220 кВ «Армавир - Центральная» до РУ 220 кВ ПС 220 кВ Ветропарк с	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующие АО «ЦИУС ЕЭС» - ПАО «Россети» (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «Кубанские магистральные сети» является стороной по сделке; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» - ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку другое подконтрольное ПАО «ФСК	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 27.11.2019 № ЦО/ВВ/1102	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	АО «Кубанские магистральные сети» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная» в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки ВЛ 220 кВ «Армавир - Центральная» до РУ 220 кВ ПС 220 кВ Армавир с образованием двух новых ВЛ 220 кВ Армавир и Ветропарк и Центральная - Ветропарк»		<p>образованием двух новых ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк и ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 536 110 533 (Пятьсот тридцать шесть миллионов сто десять тысяч пятьсот тридцать три) рублей 50 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.</p> <p>Срок выполнения Работ:</p> <p>Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Сводной таблице стоимости Договора, не позднее 20 декабря 2019 года. По итогам выполнения работ Стороны подписывают «Акт приемки законченного строительства Объекта».</p> <p>Подрядчик обязан передать Заказчику законченный реконструкцией Объект по «Акту ввода в эксплуатацию», который должен быть подписан членами приёмочной комиссии не позднее 20 декабря 2019 года при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему выполненных работ.</p>	ЕЭС» лицо - АО «Кубанские магистральные сети» являється стороной по сделке.		

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
26.	Дополнительное соглашение от 23.12.2019 № 1 к договору от 22.05.2019 № 558949 на разработку проектной документации по объектам: «ПС 500 кВ АГХК», «ПС 110 кВ ГПП-1», «ПС 110 кВ ГПП-2», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-2» между АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС».	23.12.2019	<p>Срок действия Дополнительного соглашения:</p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания срока действия Договора.</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения:</p> <p>АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Субподрядчик).</p> <p>Предмет и цена Дополнительного соглашения:</p> <p>Внесение изменений в договор от 22.05.2019 № 558949 на разработку проектной документации по объектам: «ПС 500 кВ АГХК», «ПС 110 кВ ГПП-1», «ПС 110 кВ ГПП-2», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-1», «ЛЭП 110 кВ АГХК – ГПП-2» между АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС».</p> <p>Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения за выполненную Работу согласно Договору составляет 107 124 871 (Сто семь миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 76 копеек, кроме того НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством.</p> <p>Договорная цена твердая, изменению не подлежит и включает в себя все налоги, сборы, комиссии банков.</p>	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо - ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС»), поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно - через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «НТЦ ФСК ЕЭС» является стороной по сделке; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» лицо - ПАО «ФСК ЕЭС», которое одновременно является лицом АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Корсунов П.Ю., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 27.11.2019 № ЦО/ВВ/1103	В Установленный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
27.	Дополнительное соглашение от 25.12.2019 № 1 к договору от 20.09.2019 № 573707 на выполнение ПИР по инвестиционному проекту «Строительство ПП 500 кв Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кв (для ТП энергопринимающих устройств»	25.12.2019	Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2019. Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 20.09.2019 № 573707 на выполнение ПИР по инвестиционному проекту: «Строительство ПП 500 кв Химкомбинат с заходами ВЛ 500 кв (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Амурский ГХК»)». Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости, в текущих ценах не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 117 262 433 (сто семнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результат Работ в случае их возникновения, оплата счетов Специализированных организаций и счетов Организаций по проведению экспертизы. Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до исполнения обязательств по Договору.	ЕЭС» Коновал А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Этингоф К.З., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 10.12.2019 № ЦО/ВВ/1132	В установленномный Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
28.	Дополнительное соглашение от 26.12.2019 № 1 к договору о предоставлении	26.12.2019	миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результат Работ в случае их возникновения, оплата счетов Специализированных организаций и счетов Организаций по проведению экспертизы. Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до исполнения обязательств по Договору.	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки стороны по сделке.	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом	В установленномный Законом об АО срок требования не

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
	возобновляемой заемной линии от 11.04.2019 № 554807		<p>№ 554807 о предоставлении возобновляемой заемной линии между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор). Цена Договора с учетом дополнительного соглашения № 1 состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных займов) в размере не более 1 900 000 000 (Одного миллиарда девятисот миллионов) рублей 00 копеек. - суммы процентов по займу, рассчитанных по процентной ставке, указанной в заявлении Заемщика, согласованного Заемодатцем, и равной действующей процентной ставке по заемному финансированию, привлеченному Заемодатцем для предоставления займа Заемщику плюс 1 (Один) процент. В случае если Заемодатель не осуществляет привлечение заемного финансирования для предоставления займа Заемщику, процентная ставка устанавливается равной средневзвешенной процентной ставке по внешним заимствованиям Заемодателя, действующей на первое число месяца, в котором осуществляется предоставление соответствующего займа плюс 	«ФСК ЕЭС», являющегося стороной по сделке; - контролирующие ПАО «ФСК ЕЭС» - лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - контролирующее АО «ЦИУС ЕЭС» - лицо – ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся стороной по сделке.	от 02.12.2019 № Ц0/ЧС/2144	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола) поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
29.	Дополнительное соглашение от 27.12.2019 № 2 к Договору от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций технического заказчика	27.12.2019	<p>1 (Один) процент. Срок возврата займа согласно дополнительному соглашению: Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может быть позже 31.12.2020. По согласованию Сторон срок возврата займа может быть изменен в порядке, предусмотренном п. 2.2 Договора, но в любом случае на срок не позднее 31.12.2020. Срок действия Дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); АО «ЦИУС ЕЭС» (Технический заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.03.2018 № Ц/02 на выполнение функций технического заказчика (далее – Договор). Размер вознаграждения за услуги Технического заказчика за период с 01.03.2018 по 31.12.2020 по Договору с учетом дополнительных соглашений</p>	Заинтересованные в совершении сделки лица: - контролирующие ПАО «ФСК ЕЭС» - лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «ЦИУС ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС»; - член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Извещение в адрес членов Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» направлено письмом от 05.12.2019 № Ц0/ЧС/2184	В установленном Законом об АО срок требования не поступили.

№ п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ² , срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
			№ 1, 2 составляет 6 564 861 958 (Шесть миллиардов пятьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.	Мольский А.В., одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося стороной по сделке.		

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Акционерного общества
«Центр инжиниринга и управления строительством
Единой энергетической системы»

Утверждено
Ревизионной комиссией
АО «ЦИУС ЕЭС»
Протокол от 30.04.2020 № 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Акционерного общества
«Центр инжиниринга и управления строительством
Единой энергетической системы»

ЗА 2019 ГОД

30 апреля 2020 года

г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Сведения о проверке

Сведения о составе Ревизионной комиссии:

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641
Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протокол Ревизионной комиссии от 08.07.2019 № 1
Председатель Ревизионной комиссии	Ковалева Светлана Николаевна
Секретарь Ревизионной комиссии	Тришина Светлана Михайловна
Члены Ревизионной комиссии	Царьков Виктор Владимирович
	Феоктистов Игорь Владимирович
	Рогачев Кирилл Евгеньевич

Основание ревизионной проверки: план работы Ревизионной комиссии на 2019 – 2020 корпоративный год (протокол заседания Ревизионной комиссии от 08.07.2019 № 1).

Срок проведения ревизионной проверки: В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ЦИУС ЕЭС» и Положением о Ревизионной комиссии АО «ЦИУС ЕЭС» в период с февраля по апрель 2020 года Ревизионной комиссией АО «ЦИУС ЕЭС» проведена оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете АО «ЦИУС ЕЭС», бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦИУС ЕЭС».

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019

Цель проверки: Осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦИУС ЕЭС» за 2019 год (далее - Отчетность).

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении АО «ЦИУС ЕЭС» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Ревизионная проверка осуществлялась на выборочной основе, и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦИУС ЕЭС», оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение существенных оценочных значений.

В ходе проверки был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности) в размере 217 000 тыс. руб. Под существенностью понимается свойство информации, раскрываемой в отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой отчетности. Уровень допустимой ошибки является критерием в части подтверждения достоверности отчетности АО «ЦИУС ЕЭС».

Ревизионная комиссия в ходе ревизионной проверки полагалась на Заключение аудитора АО «ЦИУС ЕЭС» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» от 14 февраля 2020 года.

Объект проверки: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦИУС», Годовой отчет АО «ЦИУС ЕЭС», решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы АО «ЦИУС ЕЭС», программы и планы, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦИУС ЕЭС».

При проведении ревизионной проверки были использованы:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иные законодательные акты и внутренние организационно-распорядительные документы АО «ЦИУС ЕЭС».

1.2. Сведения об Обществе

Полное наименование	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (далее по тексту - Общество)
Сокращенное наименование	АО «ЦИУС ЕЭС» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения (юридический адрес)	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Почтовый адрес	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1087746041151, свидетельство от 14.01.2008, серия 77 № 009741787 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица
ИНН	7728645409
Филиалы и обособленные подразделения	<ul style="list-style-type: none">• Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра Адрес: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4• Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, наб.

	Пироговская, д. 9, лит. А • Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга Адрес: 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, д. 13, к. 4 • Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала Адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 5 • Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири Адрес: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4, офис 2 • Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири Адрес: 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 66а • Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Генеральный директор Вашкевич Владимир Франтишкович с 11.09.2018 (протокол СД от 07.09.2018 № 164, Приказ от 11.09.2018 № 100/ОД).
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	Пузенко Светлана Юрьевна с 03.06.2015 – (приказ №19/Пр от 03.06.2015) по 28.02.2020 (приказ № 5/7 от 25.02.2020) Староверова Татьяна Николаевна с 06.03.2020 (приказ № 3/ЛС от 06.03.2020) по настоящее время.
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2019 год	810 человек
Основные акционеры	ПАО «ФСК ЕЭС» 100%
Основные направления деятельности	Руководство проектами в области строительства, в том числе осуществление функций заказчика-застройщика, оказание инженерных услуг при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении технологически сложных объектов

Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» является дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС», которому принадлежат 100% акций Общества.

Виды деятельности Общества определены Уставом.

Пунктом 2.9. Устава установлено, что Общество может создавать филиалы, которые не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность филиала.

Органами управления АО «ЦИУС ЕЭС» являются:

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров Общества
- Генеральный директор Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ и Уставом Общества.

Принятие решений по вопросам определения стратегии развития Общества и осуществление контроля деятельности его исполнительных органов осуществляет в соответствии с Уставом Общества Совет директоров, который избирается на общем собрании акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Действующий состав Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» избран на заседании Правления ПАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 20.09.2019 (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.09.2019 № 1659), в составе (должности указаны на момент избрания):

1. Вашкевич Владимир Франтишкович - Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»;
2. Коновал Андрей Викторович - Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»;
3. Корсунов Павел Юрьевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
4. Мольский Алексей Валерьевич – Врио Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
5. Палагин Виктор Николаевич – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
6. Юрченко Юлия Юрьевна - Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»;
7. Этингоф Константин Золевич - начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС».

1.3. Сведения об аудитор

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное наименование организации	ООО «ФинЭкспертиза»
Решение годового общего собрания акционеров по утверждению кандидатуры аудитора	Выписка из протокола заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641
Место нахождения	Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3,

	помещение X, этаж 3, ком. 1.
Государственный регистрационный номер	1027739127734
Членство в СРО	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006017998
Договор об оказании аудиторских услуг	Договор № 0279-04-а от 23.07.2019
Аудиторское заключение	Немодифицированное от 14.02.2020

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При проведении ревизионной проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Ревизионная комиссия в ходе проверки полагалась на мнение аудитора Общества, выраженное в аудиторском заключении ООО «ФинЭкспертиза» от 14.02.2020 года.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций на предмет достоверного и своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, проверка достоверности и полноты раскрытия информации в Годовом отчете.

Результатом деятельности Общества в отчетном году явился убыток в размере 845 425 тыс. руб.

По итогам 2019 года прибыль от продаж составила 147 192 тыс. руб., что на 174 205 тыс. руб. (или на 54%) меньше размера прибыли от продаж за 2018 год.

Прочие доходы за 2019 год увеличились по сравнению с 2018 годом на 2 107 897 тыс. руб. (или на 500 %) и составили 2 529 051 тыс. руб.

Прочие расходы за 2019 год увеличились по сравнению с 2018 годом на 2 585 838 тыс. руб. (или на 368 %) и составили 3 288 432 тыс. руб.

В составе прочих расходов Общества в 2019 году, в том числе, отражена сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам в размере 1 210 882,8 тыс. руб. Создание резерва по сомнительным долгам привело к уменьшению финансового результата от деятельности Общества в 2019 году. Кроме того, снижение финансового результата деятельности Общества связано с убытками от взыскания денежных средств по решениям судов в размере 548 029 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на начало 2019 года составляла 990 916 тыс. руб. при размере уставного капитала Общества 833 000 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2019 составляет 145 491 тыс. руб., то есть ниже размера уставного капитала Общества на 687 509 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 8 238 268 тыс. руб., по сравнению с началом 2019 года балансовая стоимость активов уменьшилась на 3 729 094 тыс. руб. или на 31,2 %.

Внеоборотные активы занимают 3,5% в структуре актива баланса, их величина по состоянию на 31.12.2019 составила 290 041 тыс. руб., что на 105

560 тыс. руб. или на 57,2% больше стоимости внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2018.

По состоянию на 31.12.2019 общая сумма дебиторской задолженности, по сравнению с началом 2019 года, уменьшилась на 4 601 733 тыс. руб. или на 52,9 % и составила 4 100 040 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 уменьшилась на 535 783 тыс. руб. или на 7,5% по сравнению с началом 2019 года и составила 6 598 671 тыс. руб.

На начало 2019 года заемные средства составляли 2 095 222 тыс. руб., по состоянию на 31.12.20189 заемные средства отсутствуют (погашены).

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета, составляющих учетную политику, утвержденную приказом Общества от 29.12.2018 № 267, с учетом изменений, внесенных приказом от 20.03.2019 № 73, в отчетном году соответствовала законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454 – П.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества представлен в таблице:

№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года	30.01.2020	2
2	Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2019 года	30.01.2020	2
3	Отчет об изменениях капитала за 12 месяцев 2019 года	30.01.2020	2
4	Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2019 года	30.01.2020	2
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ЦИУС ЕЭС» за 2019 год в текстовой и табличной форме	30.01.2020	57
6	Годовой отчет АО «ЦИУС ЕЭС» за 2019 год (с приложениями)	-	128

В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года, ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных во всех

существенных отношениях, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год в текстовой и табличной форме, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета Общества за 2019 год.

Председатель
Ревизионной комиссии



С.Н. Ковалева

Члены Ревизионной комиссии



С.М. Тришина



В.В. Царьков



И.В. Феоктистов



К.Е. Рогачев

